

**EEQ - Empresa Eléctrica Quito**  
**Gerencia de Comercialización**  
**Dirección Zona Urbana**

**PROYECTO: I016** EEQ-INV-Instalación de nuevos servicios, residenciales, comerciales e industriales.

|                                |                                                      |                                 |                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Líder del Proyecto:            | Cacuango Alba, Edwin Patricio (ecacuango@eeq.com.ec) |                                 |                         |
| Patrocinador Ejecutivo:        | Guerrero Melo, Mónica Patricia                       | Programas Relacionados:         |                         |
| Titular:                       | Cruz Rodriguez, Mario Alejandro                      | Prioridad:                      | 0                       |
| Tipo de Proyecto:              | Activos Fijos                                        | Retorno Económico:              | 0.00                    |
| CUP:                           |                                                      | TIR:                            | 0.00 %                  |
| Objetivos Operativos:          | 2                                                    | VAN:                            | 0.00                    |
| Viability Técnica:             | Media                                                | Estimado Al Fin Del Proyecto:   | 10,323,953.49           |
| Localidad de Gestión:          | Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito                     |                                 |                         |
| Tipo de Ppto. Externo:         |                                                      | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 01/01/2016 - 18/01/2017 |
| Fecha de última actualización: | 07/03/2017                                           | Fecha de Fin Base:              | 18/01/2017              |
| Modificado por:                | Cruz Rodriguez, Mario Alejandro                      | Fecha del siguiente Hito:       |                         |

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**

De acuerdo al Catálogo de Políticas Intersectoriales establecida por el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos MICSE la atención de nuevos servicios está orientado al cumplimiento de la política 4: "Incrementar la cobertura y la prestación del servicio de energía eléctrica", política que a la vez se alinea con el objetivo estratégico del Ministerio de Electricidad y Energías Renovables MEER "Incrementar la cobertura de servicio eléctrico en el país".

**PROPOSITO:** Atender los requerimientos de solicitudes de nuevos servicios de los clientes de las zonas: urbana y periférica; y además clientes de facturación especial, a través de la instalación de medidores polifásicos.

**PRODUCTO:** Instalación de 40.445 nuevos servicios

**Beneficios Cualitativos**

Responder a la provisión de energía eléctrica bajo principios de eficiencia, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad.

**Tipo de Beneficiario**

Clientes de facturación masiva y especial.

**Restricciones**

**Tiempo:** El proyecto tendrá la duración de un año.

**Costo:** USD 15,888,617.00


**Alcance:** Cubrirá la demanda proyectada de clientes nuevos que se incorporen al servicio de energía eléctrica y que posteriormente van a generar ingresos por concepto de facturación.

**Recursos:** Personal técnico - operativo, chóferes, vehículos, medidores polifásicos nuevos, acometidas, cajas antihurto, varillas, conectores, disyuntores, etc.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre **Completado** Congelado Cancelado

**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

## % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 100.00 %

Fecha de Inicio: 01/01/2016

Fecha de Fin: 18/01/2017

## AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

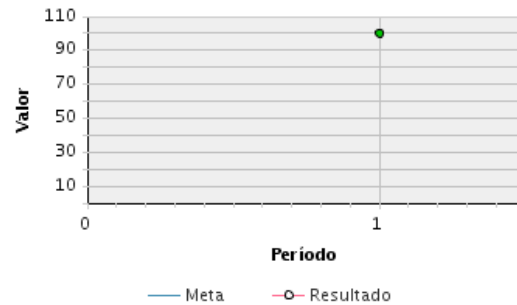

| Porcentaje de Avance |                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Año                  | Ene                         | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 2017                 | Avance programado acumulado |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                      | 100 %                       | 0 % |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                      | Avance real acumulado       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                      | 100 %                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                      | Estado                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                      |                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Modificado por                  | Fecha de última actualización |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>Enero 2017</b><br><br>1.El proyecto I016 EEQ-INV-Instalación de nuevos servicios, residenciales, comerciales e industriales; es un proyecto de inversión el mismo que se encuentra en etapa completado.<br>2.Se instalaron un total de 45.743 nuevos servicios según el avance físico mensual que corresponde al Hito 16 el cual representa el 113 % con respecto a la meta planteada de 40.445. (Fuente: Sistema SIEEQ COMERCIAL).<br>3.Los recursos financiados comprometidos y asignados para el proyecto son de USD 10.865.636 equivalente al 100%. El presupuesto devengado total es de 10.323.953,49 el porcentaje del valor programado a devengar versus el valor devengado total, es del 95,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cruz Rodriguez, Mario Alejandro | 07/03/2017 - 10:10 AM         |
| <b>DICIEMBRE 2016</b><br><br>1. El proyecto I016 EEQ-INV-Instalación de nuevos servicios, residenciales, comerciales e industriales; es un proyecto de inversión el mismo que se encuentra en etapa de ejecución.<br>2. Se instalaron 3.541 nuevos servicios, según el avance físico mensual que corresponde al hitos 15, el valor acumulado en este mes es de 45.743 nuevos servicios atendidos que representa el 113 % con respecto a la meta planteada de 40.445. (Fuente: Sistema SIEEQ COMERCIAL).<br>3. Los recursos financiados comprometidos y asignados para el proyecto son de USD 10.865.636 equivalente al 100%. El valor devengado para este mes es de USD 1.788.011,51 que corresponde al 13 % del valor comprometido.<br>4. Con la liquidación presupuestaria del año 2016, se ajusta el valor total programado a devengar a USD 10.865.636 los cuales son utilizados para la adquisición de materiales y pago de planillas servicios técnicos especializados para la instalación de nuevos servicios. | Cruz Rodriguez, Mario Alejandro | 07/03/2017 - 10:09 AM         |
| <b>NOVIEMBRE 2016</b><br><br>1. El proyecto I016 EEQ-INV-Instalación de nuevos servicios, residenciales, comerciales e industriales; es un proyecto de inversión el mismo que se encuentra en etapa de ejecución.<br>2. Se instalaron 3.808 nuevos servicios, según el avance físico mensual que corresponde al hitos 14, el valor acumulado en este mes es de 42.202 nuevos servicios atendidos que representa el 104 % con respecto a la meta planteada de 40.445. (Fuente: Sistema SIEEQ COMERCIAL).<br>3. Los recursos financiados comprometidos y asignados para el proyecto son de USD 13.121.121.63 equivalente al 100%. El valor devengado para este mes es de USD 340.562,88 que corresponde al 2,6 % del valor comprometido.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cruz Rodriguez, Mario Alejandro | 03/01/2017 - 09:06 AM         |
| <b>OCTUBRE 2016</b><br><br>1. El proyecto I016 EEQ-INV-Instalación de nuevos servicios, residenciales, comerciales e industriales; es un proyecto de inversión el mismo que se encuentra en etapa de ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cruz Rodriguez, Mario Alejandro | 02/12/2016 - 09:17 AM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Modificado por                  | Fecha de última actualización |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <p>2. Se instalaron 3.202 nuevos servicios, según el avance físico mensual que corresponde al hitos 13, el valor acumulado en este mes es de 38.394 nuevos servicios atendidos que representa el 95 % con respecto a la meta planteada de 40.445. (Fuente: Sistema SIEEQ COMERCIAL).</p> <p>3. Los recursos financiados comprometidos y asignados para el proyecto son de USD 13.121.121,63 equivalente al 100%. El valor devengado para este mes es de USD 1.155.227 que corresponde al 8,8 % del valor comprometido.</p>                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                               |
| <p><b>SEPTIEMBRE 2016</b></p> <p>1. El proyecto I016 EEQ-INV-Instalación de nuevos servicios, residenciales, comerciales e industriales; es un proyecto de inversión el mismo que se encuentra en etapa de ejecución.</p> <p>2. Se instalaron 3.897 nuevos servicios, según el avance físico mensual que corresponde al hitos 12, el valor acumulado en este mes es de 35.192 nuevos servicios atendidos que representa el 87 % con respecto a la meta planteada de 40.445. (Fuente: Sistema SIEEQ COMERCIAL).</p> <p>3. Los recursos financiados comprometidos y asignados para el proyecto son de USD 15.888.617 equivalente al 100%. El valor devengado para este mes es de USD 461.487,31 que corresponde al 2,9 % del valor comprometido.</p> | Cruz Rodriguez, Mario Alejandro | 01/11/2016 - 10:41 AM         |
| <p><b>AGOSTO 2016</b></p> <p>1. El proyecto I016 EEQ-INV-Instalación de nuevos servicios, residenciales, comerciales e industriales; es un proyecto de inversión el mismo que se encuentra en etapa de ejecución.</p> <p>2. Se instalaron 4 865 nuevos servicios, según el avance físico mensual que corresponde al hitos 11, el valor acumulado en este mes es de 31.295 nuevos servicios atendidos que representa el 77 % con respecto a la meta planteada de 40.445. (Fuente: Sistema SIEEQ COMERCIAL).</p> <p>3. Los recursos financiados comprometidos y asignados para el proyecto son de USD 15.888.617 equivalente al 100%. El valor devengado para este mes es de USD 396.007,08 que corresponde al 2,5 % del valor comprometido.</p>     | Cruz Rodriguez, Mario Alejandro | 30/09/2016 - 04:08 PM         |
| <p><b>JULIO 2016</b></p> <p>1. El proyecto I016 EEQ-INV-Instalación de nuevos servicios, residenciales, comerciales e industriales; es un proyecto de inversión el mismo que se encuentra en etapa de ejecución.</p> <p>2. Se instalaron 3.162 nuevos servicios, según el avance físico mensual que corresponde al hitos 10, el valor acumulado en este mes es de 26.430 nuevos servicios atendidos que representa el 65 % con respecto a la meta planteada de 40.445. (Fuente: Sistema SIEEQ COMERCIAL).</p> <p>3. Los recursos financiados comprometidos y asignados para el proyecto son de USD 15.888.617 equivalente al 100%. El valor devengado para este mes es de USD 607.380,15 que corresponde al 3,8 % del valor comprometido.</p>      | Cruz Rodriguez, Mario Alejandro | 01/09/2016 - 02:21 PM         |
| <p><b>JUNIO 2016</b></p> <p>1. El proyecto I016 EEQ-INV-Instalación de nuevos servicios, residenciales, comerciales e industriales; es un proyecto de inversión el mismo que se encuentra en etapa de ejecución.</p> <p>2. Se instalaron 3.802 nuevos servicios, según el avance físico mensual que corresponde al hitos 9, el valor acumulado en este mes es de 23.268 nuevos servicios atendidos que representa el 58 % con respecto a la meta planteada de 40.445. (Fuente: Sistema SIEEQ COMERCIAL).</p> <p>3. Los recursos financiados comprometidos y asignados para el proyecto son de USD 15.888.617 equivalente al 100%. El valor devengado para este mes es de USD 1.014.089,05 que corresponde al 6,4 % del valor comprometido.</p>     | Cruz Rodriguez, Mario Alejandro | 02/08/2016 - 09:57 AM         |
| <p><b>MAYO 2016</b></p> <p>1. El proyecto I016 EEQ-INV-Instalación de nuevos servicios, residenciales, comerciales e industriales; es un proyecto de inversión el mismo que se encuentra en etapa de ejecución.</p> <p>2. Se instalaron 3.956 nuevos servicios, según el avance físico mensual que corresponde al hitos 8, el valor acumulado en este mes es de 19.466 nuevos servicios atendidos que representa el 48 % con respecto a la meta planteada de 40.445. (Fuente: Sistema SIEEQ COMERCIAL).</p> <p>3. Los recursos financiados comprometidos y asignados para el proyecto son de USD 15.888.617 equivalente al 100%. El valor devengado para este mes es de USD 192.606 que corresponde al 1,2 % del valor comprometido.</p>           | Cruz Rodriguez, Mario Alejandro | 01/07/2016 - 11:11 AM         |
| <p><b>ABRIL 2016</b></p> <p>1. El proyecto I016 EEQ-INV-Instalación de nuevos servicios, residenciales, comerciales e industriales; es un proyecto de inversión el mismo que se encuentra en etapa de ejecución.</p> <p>2. Se instalaron 3.773 nuevos servicios, según el avance físico mensual que corresponde al hitos 7, el valor acumulado en este mes es de 15.510 nuevos servicios atendidos que representa el 38 % con respecto a la meta planteada de 40.445. (Fuente: Sistema SIEEQ COMERCIAL).</p> <p>3. Los recursos financiados comprometidos y asignados para el proyecto son de USD 15.888.617 equivalente al 100%. El valor devengado para este mes es de USD 2.589.905,51 que corresponde al 16,3 % del valor comprometido.</p>    | Cruz Rodriguez, Mario Alejandro | 03/06/2016 - 09:03 AM         |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Modificado por                  | Fecha de última actualización |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>MARZO 2016</b><br>1. El proyecto I016 EEQ-INV-Instalación de nuevos servicios, residenciales, comerciales e industriales; es un proyecto de inversión el mismo que se encuentra en etapa de ejecución.<br>2. Se instalaron 4.399 nuevos servicios, según el avance físico mensual que corresponde al hitos 6, el valor acumulado en este mes es de 11.737nuevos servicios atendidos que representa el 11 % con respecto a la meta planteada de 40.445. (Fuente: Sistema SIEEQ COMERCIAL).<br>3. Los recursos financiados comprometidos y asignados para el proyecto son de USD 15.888.617 equivalente al 100%. El valor devengado para este mes es de USD 164.818,13 que corresponde al 1% del valor comprometido.      | Cruz Rodriguez, Mario Alejandro | 02/05/2016 - 03:18 PM         |
| <b>FEBRERO 2016</b><br>1. El proyecto I016 EEQ-INV-Instalación de nuevos servicios, residenciales, comerciales e industriales; es un proyecto de inversión el mismo que se encuentra en etapa de ejecución.<br>2. Se instalaron 4.271 nuevos servicios, según el avance físico mensual que corresponde al hitos 5, el valor acumulado en este mes es de 7.338 nuevos servicios atendidos que representa el 11 % con respecto a la meta planteada de 40.445. (Fuente: Sistema SIEEQ COMERCIAL).<br>3. Los recursos financiados comprometidos y asignados para el proyecto son de USD 15.888.617 equivalente al 100%. El valor devengado para este mes es de USD 1.427.303,41 que corresponde al 9 % del valor comprometido. | Cruz Rodriguez, Mario Alejandro | 01/04/2016 - 05:21 PM         |
| <b>ENERO 2016</b><br>1. El proyecto I016 EEQ-INV-Instalación de nuevos servicios, residenciales, comerciales e industriales; es un proyecto de inversión el mismo que se encuentra en etapa de ejecución.<br>2. Se instalaron 3.067 nuevos servicios, según el avance físico mensual que corresponde al hitos 4, el valor acumulado en este mes es de 3.067 nuevos servicios atendidos que representa el 8 % con respecto a la meta planteada de 40.445. (Fuente: Sistema SIEEQ COMERCIAL).<br>3. Los recursos financiados comprometidos y asignados para el proyecto son de USD 15.888.617 equivalente al 100%. El valor devengado para este mes es de USD 186.555,22 que corresponde al 1,2 % del valor comprometido.    | Cruz Rodriguez, Mario Alejandro | 03/03/2016 - 04:58 PM         |

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 0

## LOCALIDADES

|   | Localidad de Impacto                                     |
|---|----------------------------------------------------------|
| 1 | Zona 2 - Centro Norte > Zona 2 > Zona 2 - (Toda la Zona) |

## HITOS

|   | Hito                                                                    | Categoría                  | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|---|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1 | DEFINICIÓN_Aprobación del proyecto                                      | 1-Solicitud de Información | 21/01/2016         |                | 21/01/2016 |          | Sí            | 10.0          |
| 2 | PLANEACIÓN_Elaboración, Aprobación, Publicación de Pliegos en el SERCOP | 2-Publicación de Pliegos   | 22/01/2016         |                | 22/01/2016 |          | Sí            | 14.0          |
| 3 | PLANEACIÓN_Adjudicación y Suscripción del Contrato                      | 3-Adjudicación             | 25/01/2016         |                | 25/01/2016 |          | Sí            | 14.0          |
| 4 | EJECUCIÓN_Informe mensual avance físico del proyecto enero              | 5-Entregables Intermedios  | 31/01/2016         |                | 31/01/2016 |          | Sí            | 4.6           |
| 5 | EJECUCIÓN_Informe mensual avance físico del proyecto febrero            | 5-Entregables Intermedios  | 29/02/2016         |                | 29/02/2016 |          | Sí            | 4.6           |
| 6 | EJECUCIÓN_Informe mensual avance físico del proyecto marzo              | 5-Entregables Intermedios  | 31/03/2016         |                | 31/03/2016 |          | Sí            | 4.6           |
| 7 | EJECUCIÓN_Informe mensual avance físico del proyecto abril              | 5-Entregables Intermedios  | 30/04/2016         |                | 30/04/2016 |          | Sí            | 4.6           |

## HITOS

|    | Hito                                                            | Categoría                              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo                                                                            | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 8  | EJECUCIÓN_Informe mensual avance físico del proyecto mayo       | 5-Entregables Intermedios              | 31/05/2016         |                | 31/05/2016 |  | Sí            | 4.6           |
| 9  | EJECUCIÓN_Informe mensual avance físico del proyecto junio      | 5-Entregables Intermedios              | 30/06/2016         |                | 30/06/2016 |  | Sí            | 4.6           |
| 10 | EJECUCIÓN_Informe mensual avance físico del proyecto julio      | 5-Entregables Intermedios              | 31/07/2016         |                | 31/07/2016 |  | Sí            | 4.6           |
| 11 | EJECUCIÓN_Informe mensual avance físico del proyecto agosto     | 5-Entregables Intermedios              | 31/08/2016         |                | 31/08/2016 |  | Sí            | 4.6           |
| 12 | EJECUCIÓN_Informe mensual avance físico del proyecto septiembre | 5-Entregables Intermedios              | 30/09/2016         |                | 30/09/2016 |  | Sí            | 4.6           |
| 13 | EJECUCIÓN_Informe mensual avance físico del proyecto octubre    | 5-Entregables Intermedios              | 31/10/2016         |                | 31/10/2016 |  | Sí            | 4.6           |
| 14 | EJECUCIÓN_Informe mensual avance físico del proyecto noviembre  | 5-Entregables Intermedios              | 30/11/2016         |                | 30/11/2016 |  | Sí            | 4.6           |
| 15 | EJECUCIÓN_Informe mensual avance físico del proyecto diciembre  | 5-Entregables Intermedios              | 31/12/2016         |                | 31/12/2016 |  | Sí            | 4.6           |
| 16 | CIERRE_Informe liquidación del proyecto                         | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 18/01/2017         |                | 18/01/2017 |  | Sí            | 6.8           |

## INDICADORES DEL PROYECTO

| Indicador                     | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|-------------------------------|--------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| No hay información disponible |        |                   |      |                       |                 |                            |


## AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

### COSTO TOTAL

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Anticipo Desembolsado:        | 0.00             |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 10,323,953.49 ** |
| Costo Total:                  | 15,890,678.78    |
| Total Devengado:              | 10,323,953.49    |
| % Costo Total Devengado:      | 64.97 %          |

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

### % COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 64.97 %

### Perfil Económico 2017

|                                                         | Años Previos    | Año Actual (2017) | Años Futuros | Total         |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------|
| Ppto. Planeado                                          | 13,309,738.63   | 0.00              | 0.00         | 13,309,738.63 |
| Ppto. Externo Planeado                                  | 0.00            | 0.00              | 0.00         | 0.00          |
| Ppto. Aprobado Inicial                                  | 13,309,738.63   | 0.00              | 0.00         | 13,309,738.63 |
| Ppto. Codificado                                        | 13,309,738.63   | 0.00              | 0.00         | 13,309,738.63 |
| Ppto. Comprometido                                      | 0.00            | 0.00              | 0.00         | 0.00          |
| Planeado - Codificado (2017)                            |                 | 0.00              |              |               |
| Programado a Devengar                                   | 10,865,636.00   | 0.00              | 0.00         | 10,865,636.00 |
| Ppto. Devengado                                         | 10,323,953.49   | 0.00              | 0.00         | 10,323,953.49 |
| Estimado a fin de año                                   | * 10,323,953.49 | 0.00              | 0.00         | 10,323,953.49 |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 541,682.51      | 0.00              | 0.00         | 541,682.51    |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado                | * 95.01 %       | 0.00 %            | 0.00 %       | 95.01 %       |
| Ppto. Codificado 998                                    | 0.00            | 0.00              | 0.00         | 0.00          |
| Ppto. Devengado 998                                     | 0.00            | 0.00              | 0.00         | 0.00          |

\* Ppto. Devengado

## OBJETIVOS ALINEADOS

### Objetivos Operativos

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | Incrementar la calidad del servicio comercial de energía eléctrica MEDIANTE la mejora de las competencias del personal de los Procesos Comercial y Atención al Cliente; incremento de la atención virtual; y, adecuación de las instalaciones para la conexión de cocinas de inducción. |
| 8 | Incrementar los servicios instalados conforme al crecimiento de la demanda MEDIANTE la atención de los requerimientos y la conexión de sistemas de medición.                                                                                                                            |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|   | Descripción de Archivo                            | Archivo | Fecha de Alta |
|---|---------------------------------------------------|---------|---------------|
| 1 | ASOCIACIÓN HITO 1 DEFINICIÓN ACTA DE CONSTITUCIÓN | A.1.pdf | 03/06/2016    |
| 2 | ASOCIACIÓN HITO 10 ENTREGABLES INTERMEDIOS JULIO  | B1.pdf  | 06/09/2016    |
| 3 | ASOCIACIÓN HITO 11 ENTREGABLES INTERMEDIOS AGOSTO | B.2.pdf | 09/09/2016    |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

|    | Descripción de Archivo                                | Archivo                               | Fecha de Alta |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 4  | ASOCIACIÓN HITO 12 ENTREGABLES INTERMEDIOS SEPTIEMBRE | B.3.pdf                               | 11/10/2016    |
| 5  | ASOCIACIÓN HITO 13 ENTREGABLES INTERMEDIOS OCTUBRE    | B.4.pdf                               | 10/11/2016    |
| 6  | ASOCIACIÓN HITO 14 ENTREGABLES INTERMEDIOS NOVIEMBRE  | B.5.pdf                               | 20/12/2016    |
| 7  | ASOCIACIÓN HITO 15 ENTREGABLES INTERMEDIOS DICIEMBRE  | B.6.pdf                               | 26/01/2017    |
| 8  | ASOCIACIÓN HITO 16.- CIERRE                           | B.7.pdf                               | 14/02/2017    |
| 9  | ASOCIACIÓN HITO 2 y 3 PLANEACIÓN                      | A.2-3.pdf                             | 03/06/2016    |
| 10 | ASOCIACIÓN HITO 4 ENTREGABLES INTERMEDIOS ENERO       | A.4.pdf                               | 03/06/2016    |
| 11 | ASOCIACIÓN HITO 5 ENTREGABLES INTERMEDIOS FEBRERO     | A.5.pdf                               | 03/06/2016    |
| 12 | ASOCIACIÓN HITO 6 ENTREGABLES INTERMEDIOS MARZO       | A.6.pdf                               | 03/06/2016    |
| 13 | ASOCIACIÓN HITO 7 ENTREGABLES INTERMEDIOS ABRIL       | A.7.pdf                               | 03/06/2016    |
| 14 | ASOCIACIÓN HITO 8 ENTREGABLES INTERMEDIOS MAYO        | A.8.pdf                               | 22/06/2016    |
| 15 | ASOCIACIÓN HITO 9 ENTREGABLES INTERMEDIOS JUNIO       | A.9.pdf                               | 07/07/2016    |
| 16 | JUSTIFICACIÓN NC POTENCIAL                            | JUSTIFICACIÓN_NC_POTENCIAL_HITO_7.pdf | 30/09/2016    |

## EQUIPO DEL PROYECTO

| Nombre                            | Rol                      | Puesto                           | Correo Electrónico     | Teléfono(s) |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------|
| Cacuango Alba, Edwin Patricio     | Líder del Proyecto       | Ingeniero Eléctrico - EEQ        | ecacuango@eeq.com.ec   |             |
| Conchambay Cóndor, Henry Fabricio | Analista Técnico         | Analista - EEQ                   | hconchambay@eeq.com.ec |             |
| Duque Dominguez, Néstor Arturo    | Coordinador del Proyecto | Ing. Dirección Zona Urbana - EEQ | nduque@eeq.com.ec      |             |
