

EEQ - Empresa Eléctrica Quito

Gerencia de Proyectos Especiales

Dirección de Programación y Financiamiento

PROYECTO: 1025 EEQ-INV-EXP-SOTERRAMIENTO IQUIQUE - DORADO CONSTRUCCIÓN OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICA

Líder del Proyecto:	Aragon Endara, Wilson Renan (waragon@eeq.com.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Balseca Granja, Milton Vicente	Programas Relacionados:	
Titular:	Flores Rodríguez, Andres David	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	3,981,314.00
Localidad de Gestión:	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Toda la Provincia de Pichincha		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2019 - 31/12/2019
Fecha de última actualización:	04/02/2019	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Aragon Endara, Wilson Renan	Fecha del siguiente Hito:	28/02/2019

DATOS GENERALES

Descripción

Convertido del Proyecto de Inversión K016 el 15/01/2019

Beneficios Cualitativos

Toda el área de servicio de la EEQ

Tipo de Beneficiario

Clientes que habitan en el área de servicio de la EEQ

PP. 1210116147120240

Restricciones

TIEMPO:
12 meses

COSTO:
Se ejecutará con recursos propios y personal de la EEQ, valor USD. 3'981.314,40 incluido IVA


ALCANCE:
Se ejecutará con información registrada en la herramienta GPR, en los tiempos establecidos por la SEMPLADES

RECURSOS:
Los disponibles en la EEQ

Fase Actual: **Anteproyecto** Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 11.78 %

Fecha de Inicio: 01/01/2019

Fecha de Fin: 31/12/2019

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

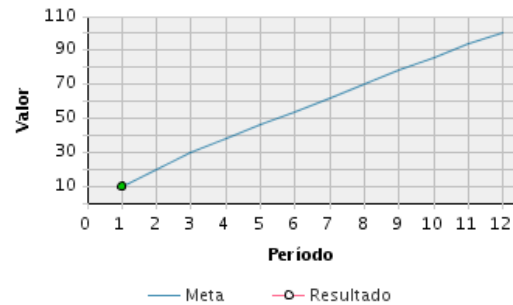

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
	10 %	20 %	30 %	38 %	46 %	54 %	62 %	70 %	78 %	86 %	94 %	100 %
	Avance real acumulado											
	10 %											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ENERO 2019: 1. Publicación del PAC 2019 (hito 1 cumplido)	Aragon Endara, Wilson Renan	01/02/2019 - 09:57 PM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. * General. La falta de recursos económicos CAUSARÍA la no ejecución de los proyectos	21/01/2019	Wilson Renan Aragón Endara	30 %	70	21	0/0

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Toda la Provincia de Pichincha

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PIANEACIÓN_Avance Enero	1-Solicitud de Información	31/01/2019		31/01/2019		Sí	10.0
2	PLANEACIÓN_Avance Febrero	1-Solicitud de Información	28/02/2019	28/02/2019			No	10.0
3	EJECUCIÓN_Avance Marzo, Diseños completos para la ejecución de la obra	4-Inicio de Trabajo	31/03/2019	31/03/2019			No	10.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
4	EJECUCIÓN_Avance Abril	5-Entregables Intermedios	30/04/2019	30/04/2019			No	8.0
5	EJECUCIÓN_Avance Mayo	5-Entregables Intermedios	31/05/2019	31/05/2019			No	8.0
6	EJECUCIÓN_Avance Junio	5-Entregables Intermedios	30/06/2019	30/06/2019			No	8.0
7	EJECUCIÓN_Avance Julio	5-Entregables Intermedios	31/07/2019	31/07/2019			No	8.0
8	EJECUCIÓN_Avance Agosto	5-Entregables Intermedios	31/08/2019	31/08/2019			No	8.0
9	EJECUCIÓN_Avance Septiembre	5-Entregables Intermedios	30/09/2019	30/09/2019			No	8.0
10	EJECUCIÓN_Avance Octubre	5-Entregables Intermedios	31/10/2019	31/10/2019			No	8.0
11	EJECUCIÓN_Avance Noviembre	5-Entregables Intermedios	30/11/2019	30/11/2019			No	8.0
12	CIERRE_Avance Diciembre	9-Entregables Formales	31/12/2019	31/12/2019			No	6.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	3,981,314.00 **
Costo Total:	3,981,314.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2019

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	3,981,314.00	0.00	3,981,314.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	3,981,314.00	0.00	3,981,314.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	3,981,314.00	0.00	3,981,314.00
Ppto. Codificado	0.00	3,981,314.00	0.00	3,981,314.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2019)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	3,981,314.00	0.00	3,981,314.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	3,981,314.00	0.00	3,981,314.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019



Presupuesto Mensual 2019

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00		0.00				
Mar	0.00		0.00				
Abr	0.00		0.00				
May	0.00		0.00				
Jun	0.00		0.00				
Jul	0.00		0.00				
Ago	0.00		0.00				
Sep	0.00		0.00				
Oct	0.00		0.00				
Nov	0.00		0.00				
Dic	3,981,314.00		3,981,314.00				
Total	3,981,314.00	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
4	Incrementar la ejecución de proyectos de infraestructura MEDIANTE el diseño, construcción y fiscalización de obras

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ASOCIACIÓN HITO 1-Avance Enero	A.2_Publicación_PAC2019.pdf	01/02/2019

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Hurtado, Angel	Topografía	Ingeniero Civil	aphurtado@eeq.com.ec	
Jácome González, Alexandra Paola	Ingeniería Ambiental	LIDER DE PROYECTO PARTICIPACION SOCIO AMBIENTAL - EEQ	pjacome@eeq.com.ec	
Martínez Palacios, Bolívar	Ingeniería Eléctrica	Ingeniero Eléctrico	bmartinez@eeq.com.ec	
Orellana Leon, Christian Xavier	Ingeniería Hidráulica	Ingeniero Civil	cxorellana@eeq.com.ec	
Tannhauser, Arevalo Granda	Ingeniería Civil	Ingeniero Civil	tarevalo@eeq.com.ec	
Tannhauser, Arevalo Granda	Fiscalización	Ingeniero Civil	tarevalo@eeq.com.ec	
