

EEQ - Empresa Eléctrica Quito
Gerencia de Generación y Subtransmisión
Dirección de Generación

PROYECTO: I061 EEQ-INV-Protección del Entorno Ecológico en el Área de Amortiguamiento del Refugio de Vida Silvestre Pasochoa con el Mantenimiento de la vía de acceso a la instalación "Tanque de Cabeza" de la Central Hidroeléctrica Pasochoa

Líder del Proyecto:	Enríquez Puyol, Oscar Gabriel (oenriquez@eeq.com.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Gómez Miranda, Luis Fernando	Programas Relacionados:	
Titular:	Freire Pástor, Carlos Roberto	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	74,480.00
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/05/2018 - 31/12/2018
Fecha de última actualización:	23/03/2018	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Enríquez Puyol, Oscar Gabriel	Fecha del siguiente Hito:	15/05/2018


DATOS GENERALES

Descripción
Reducir la frecuencia de los impactos ambientales provocados por actividades de mantenimiento de vía con maquinaria pesada.
Beneficios Cualitativos
Proteger el Refugio de Vida Silvestre Pasochoa
Tipo de Beneficiario
El Refugio de Vida Silvestre Pasochoa y usuarios de la vía: Empresa Eléctrica Quito, Moradores del sector aledaño, Empresa de Agua Potable y turistas en general
Restricciones
<p>TIEMPO: Este proyecto deberá ser ejecutado en el periodo de 3 meses contados a partir de entrega de anticipo.</p> <p>COSTO: El presupuesto asignado para la ejecución de este proyecto es de \$ 74,480.00</p> <p>CALIDAD: Los equipos a ser instalados deben cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en los pliegos</p>

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	---------------------	------------	------------	-----------	--------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Fecha de Inicio: 01/05/2018 Fecha de Fin: 31/12/2018

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	Avance programado acumulado											
					8 %	13 %	21 %	36 %	54 %	72 %	90 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
No hay información disponible		

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Rumiñahui

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANIFICACIÓN: Solicitud de servicio y TDRs elaborados	4-Inicio de Trabajo	15/05/2018	15/05/2018			No	8.0
2	PLANIFICACIÓN: Publicación de pliegos realizada.	2-Publicación de Pliegos	14/06/2018	14/06/2018			No	5.0
3	PLANIFICACIÓN: Adjudicación y elaboración de contrato realizado.	3-Adjudicación	19/07/2018	19/07/2018			No	8.0
4	EJECUCIÓN: Inicio de trabajos ejecutados	4-Inicio de Trabajo	16/08/2018	16/08/2018			No	15.0
5	EJECUCIÓN: Trabajos realizados mes septiembre	5-Entregables Intermedios	20/09/2018	20/09/2018			No	18.0
6	EJECUCIÓN: Trabajos realizados mes octubre	5-Entregables Intermedios	18/10/2018	18/10/2018			No	18.0
7	EJECUCIÓN: Trabajos realizados mes noviembre	5-Entregables Intermedios	15/11/2018	15/11/2018			No	18.0
8	CIERRE: Recepción provisional realizada	9-Entregables Formales	20/12/2018	20/12/2018			No	10.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	74,480.00 **
Costo Total:	74,480.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2018

	Años Previos	Año Actual (2018)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	74,480.00	0.00	74,480.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	74,480.00	0.00	74,480.00
Ppto. Codificado	0.00	74,480.00	0.00	74,480.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2018)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	74,480.00	0.00	74,480.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	74,480.00	0.00	74,480.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2018

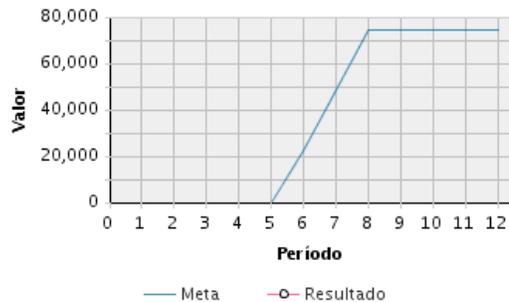

Presupuesto Mensual 2018

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene							

Presupuesto Mensual 2018							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb							
Mar							
Abr							
May	0.00		0.00				
Jun	22,344.00		22,344.00				
Jul	26,068.00		48,412.00				
Ago	26,068.00		74,480.00				
Sep	0.00		74,480.00				
Oct	0.00		74,480.00				
Nov	0.00		74,480.00				
Dic	0.00		74,480.00				
Total	74,480.00						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
3	Incrementar la disponibilidad por Operación y Mantenimiento de las Centrales de Generación MEDIANTE la ejecución del plan anual de mantenimiento y el cumplimiento de las inversiones de calidad.
