

EEQ - Empresa Eléctrica Quito
Gerencia de Distribución
Dirección Diseño y Ejecución

PROYECTO: I030 MEER, Plan de Mejoramiento de los Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica - PMD - RSND CAF - Empresa Eléctrica Quito

Líder del Proyecto:	Cevallos Argoti, Fausto Iván (facevallos@eeq.com.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Gómez Miranda, Luis Fernando	Programas Relacionados:	
Titular:	Naranjo Demera, Edison	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Activos Fijos	Retorno Económico:	36,274,865.49
CUP:	144280000.461.2527	TIR:	19.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	372,896,005.44
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	20,732,955.10
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2015 - 30/01/2018
Fecha de última actualización:	04/08/2017	Fecha de Fin Base:	30/01/2018
Modificado por:	Cevallos Argoti, Fausto Iván	Fecha del siguiente Hito:	31/07/2017

DATOS GENERALES

Descripción

Descripción: Los Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución - RSND, dan atención a requerimientos de los clientes que se registran en el Portal WEB "Ecuador Cambia"- SIPEC s Plan de Cocinas de Inducción Programa de Eficiencia Energética para cocción por inducción y calentamiento de agua con electricidad -PEC.

Objetivo del Plan: Implementación del cambio de la matriz energética en el cambio de cocinas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) a cocinas de inducción por la Empresa Eléctrica Quito mediante cambio de transformadores de Distribución, redes de Bajo Voltaje a, acometidas y medidores.

Línea Base: Se establece como referencia el nivel de calidad de servicio eléctrico (FMIk, TTIk y PEF) establecido por la EEQ de junio 2015:
 FMIk = 5.28 veces; TTIk = 4.87 horas; PEF = 1%

Estrategia del Plan: La ejecución estará a cargo de la Empresa Eléctrica Quito, con el financiamiento y coordinación del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, - MEER. El ARCONEL realizará de forma periódica el seguimiento y control del avance económico y físico de los proyectos incluidos en este Programa. Para el año 2015, el PRSND-CAF se ejecutará bajo los sistemas de construcción y repotenciación de redes de distribución con provisión de materiales y mano de obras contratadas, en el período comprendido entre mayo del 2015 hasta Abril del 2016.

Beneficios Cualitativos

Mantener la calidad de eficiencia energética en la producción, distribución y consumo de la electricidad, con un financiamiento externo sostenible y sustentable que nos permite cumplir con las metas establecidas

Tipo de Beneficiario

Todos los usuarios ubicados dentro del área de servicio de la Empresa Eléctrica Quito.

Restricciones

COSTO: El programa tiene un presupuesto de USD 22,026,704.92


TIEMPO: El programa tendrá una duración de 12 meses

ALCANCE: No exista priorización del programa, factores sociales y climáticos.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 84.55 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2015 Fecha de Fin: 30/01/2018

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

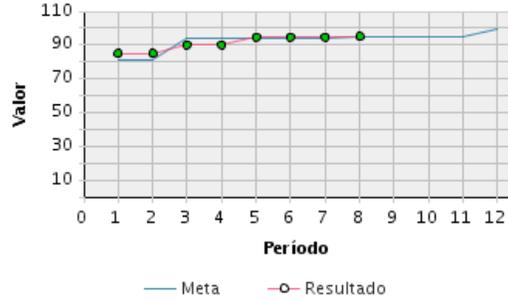

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2017	Avance programado acumulado											
	81 %	81 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	95 %	95 %	95 %	100 %
	Avance real acumulado											
	85 %	85 %	90 %	90 %	95 %	95 %	95 %	95 %				
Estado												
	●	●	●	●	●	●	●	●				

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>JULIO 2017</p> <p>El RSND CAF consta de 23 procesos, 14 procesos están en la etapa de ejecución y 9 están concluidos. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos alcanzan el monto de USD 21,622,527.48, que representa el 98% de lo asignado para el año 2016. Los recursos por contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 9,540,696.22, que representa el 43.31% de lo asignado para el año 2016. Los indicadores de "Calidad de Servicio Eléctrico", alcanzan los siguientes valores: FMlk = 2.52 veces, TTlk = 1.82 horas y PEF = 0.18%.</p>	Cevallos Argoti, Fausto Iván	04/08/2017 - 10:54 AM
<p>JUNIO 2017</p> <p>El RSND CAF consta de 23 procesos, 15 procesos están en la etapa de ejecución y 8 están concluidos. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos alcanzan el monto de USD 21,622,527.48, que representa el 98% de lo asignado para el año 2016. Los recursos por contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 9,293,180.01, que representa el 42.19% de lo asignado para el año 2016. Los indicadores de "Calidad de Servicio Eléctrico", alcanzan los siguientes valores: FMlk = 2.61 veces, TTlk = 1.86 horas y PEF = 0.18%.</p>	Cevallos Argoti, Fausto Iván	04/08/2017 - 10:54 AM
<p>MAYO 2017</p> <p>El RSND CAF consta de 23 procesos, 15 procesos están en la etapa de ejecución y 8 están concluidos. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos alcanzan el monto de USD 21,622,527.48, que representa el 98% de lo asignado para el año 2016. Los recursos por contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 9,293,180.01, que representa el 42.19% de lo asignado para el año 2016. Los indicadores de "Calidad de Servicio Eléctrico", alcanzan los siguientes valores: FMlk = 2.23 veces, TTlk = 1.72 horas y PEF = 0.18%</p>	Novillo Logroño, Patricio de la Cruz	05/07/2017 - 09:59 AM
<p>ABRIL 2017</p> <p>El RSND CAF consta de 23 procesos, 18 procesos están en la etapa de ejecución y 5 están concluidos. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos alcanzan el monto de USD 21,622,527.48, que representa el 98% de lo asignado para el año 2016. Los recursos por</p>	Novillo Logroño, Patricio de la Cruz	01/06/2017 - 11:24 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 7,364,800.64, que representa el 34.06% de lo asignado para el año 2016. Los indicadores de "Calidad de Servicio Eléctrico", alcanzan los siguientes valores: FMlk = 2.28 veces, TTik = 1.74 horas y PEF = 0.18%</p>		
<p>MARZO 2017</p> <p>El RSND CAF consta de 23 procesos, 20 procesos están en la etapa de ejecución y 3 están concluidos. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos alcanzan el monto de USD 21,622,527.48, que representa el 98% de lo asignado para el año 2016. Los recursos por contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 5,502,500.00, que representa el 25.45% de lo asignado para el año 2016. Los indicadores de "Calidad de Servicio Eléctrico", alcanzan los siguientes valores: FMlk = 2.21 veces, TTik = 1.80 horas y PEF = 0.18%</p>	Novillo Logroño, Patricio de la Cruz	02/05/2017 - 02:07 PM
<p>FEBRERO 2017</p> <p>El RSND CAF consta de 23 procesos, 22 procesos están en la etapa de ejecución y 1 está concluido. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos alcanzan el monto de USD 21,622,527.48, que representa el 98% de lo asignado para el año 2016. Los indicadores de "Calidad de Servicio Eléctrico", alcanzan los siguientes valores: FMlk = 2.71 veces, TTik = 2.29 horas y PEF = 0.18%</p>	Novillo Logroño, Patricio de la Cruz	31/03/2017 - 10:43 AM
<p>ENERO 2017</p> <p>El RSND CAF consta de 23 procesos, 22 procesos están en la etapa de ejecución y 1 está concluido. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos alcanzan el monto de USD 21,622,527.48, que representa el 98% de lo asignado para el año 2016. Los indicadores de "Calidad de Servicio Eléctrico", alcanzan los siguientes valores: FMlk = 2.71 veces, TTik = 2.29 horas y PEF = 0.18%</p>	Novillo Logroño, Patricio de la Cruz	03/03/2017 - 11:50 AM
<p>DICIEMBRE 2016</p> <p>El RSND CAF consta de 23 procesos, 22 procesos estan en la etapa de ejecución y 1 concluido. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos alcanzan el monto de USD 23,115,231.04, que representa el 84.40% de lo asignado para el año 2015. Los indicadores de "Calidad de Servicio Eléctrico", alcanzan los siguientes valores: FMlk = 2.84 veces, TTik = 2.43 horas y PEF = 0.18%</p>	Novillo Logroño, Patricio de la Cruz	02/02/2017 - 08:22 AM
<p>NOVIEMBRE 2016</p> <p>El RSND CAF consta de 23 procesos, 22 procesos estan en la etapa de ejecución y 1 concluido. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos alcanzan el monto de USD 23,115,231.04, que representa el 83.30% de lo asignado para el año 2015. Los indicadores de "Calidad de Servicio Eléctrico", alcanzan los siguientes valores: FMlk = 3.07 veces, TTik = 2.50 horas y PEF = 0.18%</p>	Novillo Logroño, Patricio de la Cruz	29/12/2016 - 09:04 AM
<p>OCTUBRE 2016</p> <p>El RSND CAF consta de 23 procesos, 22 procesos estan en la etapa de ejecución y 1 concluido. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos alcanzan el monto de USD 23,115,231.04, que representa el 82.68% de lo asignado para el año 2015. Los indicadores de "Calidad de Servicio Eléctrico", alcanzan los siguientes valores: FMlk = 3.06 veces, TTik = 2.49 horas y PEF = 0.18%</p>	Novillo Logroño, Patricio de la Cruz	01/12/2016 - 12:37 PM
<p>SEPTIEMBRE 2016</p> <p>El RSND CAF consta de 23 procesos, 22 procesos estan en la etapa de ejecución y 1 concluido. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos alcanzan el monto de USD 23,115,231.04, que representa el 82.10% de lo asignado para el año 2015. Los indicadores de "Calidad de Servicio Eléctrico", alcanzan los siguientes valores: FMlk = 3.17 veces, TTik = 2.46 horas y PEF = 0.17%</p>	Novillo Logroño, Patricio de la Cruz	01/11/2016 - 12:55 PM
<p>AGOSTO 2016</p> <p>El RSND CAF consta de 23 procesos, 22 procesos estan en la etapa de ejecución y 1 en cierre. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos alcanzan el monto de USD 23,115,231.04, que representa el 81.28% de lo asignado para el año 2015.</p>	Novillo Logroño, Patricio de la Cruz	04/10/2016 - 08:55 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Los indicadores de "Calidad de Servicio Eléctrico", alcanzan los siguientes valores: FMIk = 2.99 veces, TTIk = 2.21 horas y PEF = 0.16%		
<p>JULIO 2016</p> <p>El RSND CAF consta de 23 procesos, 22 procesos estan en la etapa de ejecución y 1 en cierre. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos alcanzan el monto de USD 23,115,231.04, que representa el 78.67% de lo asignado para el año 2015. Los indicadores de "Calidad de Servicio Eléctrico", alcanzan los siguientes valores: FMIk = 3.21 veces, TTIk = 2.43 horas y PEF = 0.16%</p>	Novillo Logroño, Patricio de la Cruz	31/08/2016 - 02:44 PM
<p>JUNIO 2016</p> <p>El RSND CAF consta de 23 procesos, los cuales se encuentran en la etapa de ejecución. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos alcanzan el monto de USD 23,115,231.04, que representa el 78.39% de lo asignado para el año 2015. Los indicadores de "Calidad de Servicio Eléctrico", alcanzan los siguientes valores: FMIk = 3.21 veces, TTIk = 2.51 horas y PEF = 0.16%</p>	Novillo Logroño, Patricio de la Cruz	02/08/2016 - 12:04 PM
<p>MAYO 2016</p> <p>El RSND CAF consta de 23 procesos, los cuales se encuentran en la etapa de ejecución. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos alcanzan el monto de USD 23,115,231.04, que representa el 77.74% de lo asignado para el año 2015. Los indicadores de "Calidad de Servicio Eléctrico", alcanzan los siguientes valores: FMIk = 3.35 veces, TTIk = 2.66 horas y PEF = 0.16%</p>	Novillo Logroño, Patricio de la Cruz	04/07/2016 - 12:15 PM
<p>ABRIL 2016</p> <p>El RSND CAF consta de 23 procesos, los cuales se encuentran en la etapa de ejecución. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos alcanzan el monto de USD 23,115,231.04, que representa el 77.74% del total asignado para el año 2015. Los indicadores de "Calidad de Servicio Eléctrico", alcanzan los siguientes valores: FMIk = 3.43 veces, TTIk = 2.73 horas y PEF = 0.16%</p>	Novillo Logroño, Patricio de la Cruz	31/05/2016 - 02:01 PM
<p>MARZO 2016</p> <p>El RSND CAF consta de 23 procesos, los cuales se encuentran en la etapa de ejecución. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos alcanzan el monto de USD 23,115,231.04, que representa el 70.83% del total asignado para el año 2015. Los indicadores de "Calidad de Servicio Eléctrico", alcanzan los siguientes valores: FMIk = 3.51 veces, TTIk = 2.65 horas y PEF = 0.16%</p>	Novillo Logroño, Patricio de la Cruz	02/05/2016 - 11:21 AM
<p>FEBRERO 2016</p> <p>El RSND CAF consta de 23 procesos, los cuales se encuentran en la etapa de ejecución. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos alcanzan el monto de USD 23,115,231.04, que representa el 70.83% del total asignado para el año 2015. Los indicadores de "Calidad de Servicio Eléctrico", alcanzan los siguientes valores: FMIk = 3.74 veces, TTIk = 2.68 horas y PEF = 0.16%</p>	Novillo Logroño, Patricio de la Cruz	04/04/2016 - 10:12 AM
<p>ENERO 2016</p> <p>El RSND CAF consta de 23 procesos, los cuales se encuentran en la etapa de ejecución. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos alcanzan el monto de USD 23,115,231.04, que representa el 88.34% del total asignado para el año 2015. Los indicadores de "Calidad de Servicio Eléctrico", alcanzan los siguientes valores: FMIk = 3.79 veces, TTIk = 2.58 horas y PEF = 0.16%</p>	Novillo Logroño, Patricio de la Cruz	03/03/2016 - 11:24 AM
<p>DICIEMBRE 2015</p> <p>El RSND CAF consta de 23 procesos, los cuales se encuentran en la etapa de ejecución. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos alcanzan el monto de USD 23,115,231.04, que representa el 88.34% del total asignado para el año 2015. Los indicadores de "Calidad de Servicio Eléctrico", alcanzan los siguientes valores: FMIk = 3.72 veces, TTIk = 2.43 horas y PEF = 0.16%</p>	Novillo Logroño, Patricio de la Cruz	03/02/2016 - 02:51 PM
<p>NOVIEMBRE 2015</p> <p>El programa RSND CAF consta de 23 procesos, los cuales están en la etapa de ejecución. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos alcanzan el monto de USD 17,079,616.65; de los cuales se ha transferido USD 11,086,776.41 que representa 110.3% del total asignado con corte a noviembre según avance para el año 2015.</p>	Novillo Logroño, Patricio de la Cruz	04/01/2016 - 08:21 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Los indicadores de "Calidad de Servicio Eléctrico", alcanzan los siguientes valores: FMIk = 3.84 veces, TTIk = 2.58 horas y PEF = 0.15%.		
<p>OCTUBRE 2015</p> <p>El programa RSND CAF consta de 23 procesos, los cuales están en la etapa de ejecución. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos alcanzan el monto de USD 17,079,616.65; que representa el 88.22% del total asignado para el año 2015. Los indicadores de "Calidad de Servicio Eléctrico", alcanzan los siguientes valores: FMIk = 4.18 veces, TTIk = 2.89 horas y PEF = 0.12%.</p>	Novillo Logroño, Patricio de la Cruz	03/12/2015 - 02:50 PM
<p>SEPTIEMBRE 2015</p> <p>El programa RSND CAF consta de 23 procesos, los cuales están en la etapa de ejecución. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos alcanzan el monto de USD 17,079,616.65, que representa 40% del total asignado para el año 2015. Los indicadores de "Calidad de Servicio Eléctrico" alcanzan los siguientes valores: FMIk=4.05 veces, TTIk= 2.94 horas y PEF=0.13%</p>	Novillo Logroño, Patricio de la Cruz	30/10/2015 - 02:18 PM
<p>AGOSTO 2015</p> <p>El programa PRSND CAF consta de 23 procesos, los cuales están finalizando la etapa pre contractual e iniciando la etapa de construcción. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos alcanzan el monto de USD 17,079,616.65, que representa 40% del total asignado con corte agosto según avance para el año 2015.</p>	Novillo Logroño, Patricio de la Cruz	05/10/2015 - 02:27 PM
<p>JULIO 2015</p> <p>Durante el mes de julio se cumplieron los Hitos del 1 al 24, referente a la publicación para los procesos de contratación para los proyectos CAF reforzamiento de redes de bajo voltaje con repotenciación de transformadores acometidas y medidores en primarios de distribución. Se espera la adjudicación de estos procesos y posterior la contratación para ejecución de dicho proyecto.</p>	Novillo Logroño, Patricio de la Cruz	03/09/2015 - 08:37 AM
<p>ENERO - JUNIO 2015</p> <p>Los procesos de contratación corporativo de la EEQ con financiación del Banco de Desarrollo de América Latina - CAF, que comprenden la : Provisión de medidores electrónicos bifásicos de energía eléctrica y Reforzamiento de Redes EEQ, iniciaron con la publicación de pliegos en diciembre 2014 cumpliendo con las fechas del cronograma establecido para la etapa pre-contractual y de adjudicación. Al momento se encuentran en la etapa de adquisición de materiales.</p>	Novillo Logroño, Patricio de la Cruz	03/09/2015 - 08:35 AM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<p>2- NACIONAL. * General.</p> <p>El invierno CAUSARÍA retraso en la culminación física de las obras.</p>	05/06/2017	Patricio de la Cruz Novillo Logroño	20 %	20	4	0/1

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Toda la Provincia de Pichincha

HITOS

Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1 PLANEACIÓN_Publicación_CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-001	2-Publicación de Pliegos	31/07/2015		24/07/2015		Sí	0.2

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
2	PLANEACIÓN_Publicación_CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-004	2-Publicación de Pliegos	31/07/2015		24/07/2015		Sí	0.2
3	PLANEACIÓN_Publicación_CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-006	2-Publicación de Pliegos	31/07/2015		24/07/2015		Sí	0.2
4	PLANEACIÓN_Publicación_CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-007	2-Publicación de Pliegos	31/07/2015		24/07/2015		Sí	0.2
5	PLANEACIÓN_Publicación_CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-008	2-Publicación de Pliegos	31/07/2015		24/07/2015		Sí	0.2
6	PLANEACIÓN_Publicación_CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-009	2-Publicación de Pliegos	31/07/2015		24/07/2015		Sí	0.2
7	PLANEACIÓN_Publicación_CAF-RSND-EEQ-DI-BS-001_CORPORATIVO	2-Publicación de Pliegos	31/07/2015		24/07/2015		Sí	4.66
8	PLANEACIÓN_Publicación_CAF-RSND-EEQ-LPI-BI-002	2-Publicación de Pliegos	31/07/2015		24/07/2015		Sí	0.8
9	PLANEACIÓN_Publicación_CAF-RSND-EEQ-LPI-BI-003	2-Publicación de Pliegos	31/07/2015		24/07/2015		Sí	0.5
10	PLANEACIÓN_Publicación_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-001	2-Publicación de Pliegos	31/07/2015		24/07/2015		Sí	1.0
11	PLANEACIÓN_Publicación_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-002	2-Publicación de Pliegos	31/07/2015		24/07/2015		Sí	1.1
12	PLANEACIÓN_Publicación_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-003	2-Publicación de Pliegos	31/07/2015		24/07/2015		Sí	0.8
13	PLANEACIÓN_Publicación_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-004	2-Publicación de Pliegos	31/07/2015		24/07/2015		Sí	1.0
14	PLANEACIÓN_Publicación_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-006	2-Publicación de Pliegos	31/07/2015		24/07/2015		Sí	1.0
15	PLANEACIÓN_Publicación_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-007	2-Publicación de Pliegos	31/07/2015		24/07/2015		Sí	1.0
16	PLANEACIÓN_Publicación_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-008	2-Publicación de Pliegos	31/07/2015		24/07/2015		Sí	0.9
17	PLANEACIÓN_Publicación_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-009	2-Publicación de Pliegos	31/07/2015		24/07/2015		Sí	0.9
18	PLANEACIÓN_Publicación_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-010	2-Publicación de Pliegos	31/07/2015		24/07/2015		Sí	0.5
19	PLANEACIÓN_Publicación_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-011	2-Publicación de Pliegos	31/07/2015		24/07/2015		Sí	1.1
20	PLANEACIÓN_Publicación_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-012	2-Publicación de Pliegos	31/07/2015		24/07/2015		Sí	0.9
21	PLANEACIÓN_Publicación_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-013	2-Publicación de Pliegos	31/07/2015		24/07/2015		Sí	0.7
22	PLANEACIÓN_Publicación_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-014	2-Publicación de Pliegos	31/07/2015		24/07/2015		Sí	1.0
23	PLANEACIÓN_Publicación_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-015	2-Publicación de Pliegos	31/07/2015		24/07/2015		Sí	0.8
24	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del RSND CAF_Julio 2015	5-Entregables Intermedios	15/08/2015		30/07/2015		Sí	0.1
25	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del RSND CAF_Agosto 2015	5-Entregables Intermedios	15/09/2015		30/08/2015		Sí	0.1
26	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del RSND CAF_Septiembre 2015	5-Entregables Intermedios	15/10/2015		30/09/2015		Sí	0.1
27	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del RSND CAF_Octubre 2015	5-Entregables Intermedios	15/11/2015		30/10/2015		Sí	0.1

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
28	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del RSND CAF_Noviembre 2015	5-Entregables Intermedios	15/12/2015		30/11/2015		Sí	0.1
29	PLANEACIÓN_Contratación_CAF3-Adjudicación RSND-EEQ-CPN-FC-001		30/12/2015		05/03/2015		Sí	0.2
30	PLANEACIÓN_Contratación_CAF3-Adjudicación RSND-EEQ-CPN-FC-004		30/12/2015		12/03/2015		Sí	0.2
31	PLANEACIÓN_Contratación_CAF3-Adjudicación RSND-EEQ-CPN-FC-006		30/12/2015		20/03/2015		Sí	0.2
32	PLANEACIÓN_Contratación_CAF3-Adjudicación RSND-EEQ-CPN-FC-007		30/12/2015		11/05/2015		Sí	0.2
33	PLANEACIÓN_Contratación_CAF3-Adjudicación RSND-EEQ-CPN-FC-008		30/12/2015		11/05/2015		Sí	0.2
34	PLANEACIÓN_Contratación_CAF3-Adjudicación RSND-EEQ-CPN-FC-009		30/12/2015		11/05/2015		Sí	0.2
35	PLANEACIÓN_Contratación_CAF3-Adjudicación RSND-EEQ-DI-BS-001_CORPORATIVO		30/12/2015		30/12/2015		Sí	4.6
36	PLANEACIÓN_Contratación_CAF3-Adjudicación RSND-EEQ-LPI-BI-002		30/12/2015		30/12/2015		Sí	0.8
37	PLANEACIÓN_Contratación_CAF3-Adjudicación RSND-EEQ-LPI-BI-003		30/12/2015		30/12/2015		Sí	0.5
38	PLANEACIÓN_Contratación_CAF3-Adjudicación RSND-EEQ-LPN-OB-001		30/12/2015		20/03/2015		Sí	1.0
39	PLANEACIÓN_Contratación_CAF3-Adjudicación RSND-EEQ-LPN-OB-002		30/12/2015		12/03/2015		Sí	1.1
40	PLANEACIÓN_Contratación_CAF3-Adjudicación RSND-EEQ-LPN-OB-003		30/12/2015		17/03/2015		Sí	0.8
41	PLANEACIÓN_Contratación_CAF3-Adjudicación RSND-EEQ-LPN-OB-004		30/12/2015		17/03/2015		Sí	1.0
42	PLANEACIÓN_Contratación_CAF3-Adjudicación RSND-EEQ-LPN-OB-006		30/12/2015		20/03/2015		Sí	1.0
43	PLANEACIÓN_Contratación_CAF3-Adjudicación RSND-EEQ-LPN-OB-007		30/12/2015		06/04/2015		Sí	1.0
44	PLANEACIÓN_Contratación_CAF3-Adjudicación RSND-EEQ-LPN-OB-008		30/12/2015		06/04/2015		Sí	0.9
45	PLANEACIÓN_Contratación_CAF3-Adjudicación RSND-EEQ-LPN-OB-009		30/12/2015		06/04/2015		Sí	0.9
46	PLANEACIÓN_Contratación_CAF3-Adjudicación RSND-EEQ-LPN-OB-010		30/12/2015		07/04/2015		Sí	0.5
47	PLANEACIÓN_Contratación_CAF3-Adjudicación RSND-EEQ-LPN-OB-011		30/12/2015		07/04/2015		Sí	1.1
48	PLANEACIÓN_Contratación_CAF3-Adjudicación RSND-EEQ-LPN-OB-012		30/12/2015		07/04/2015		Sí	0.9
49	PLANEACIÓN_Contratación_CAF3-Adjudicación RSND-EEQ-LPN-OB-013		30/12/2015		07/04/2015		Sí	0.7
50	PLANEACIÓN_Contratación_CAF3-Adjudicación RSND-EEQ-LPN-OB-014		30/12/2015		07/04/2015		Sí	1.0
51	PLANEACIÓN_Contratación_CAF3-Adjudicación RSND-EEQ-LPN-OB-015		30/12/2015		28/05/2015		Sí	0.8
52	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del RSND CAF_Diciembre 2015	5-Entregables Intermedios	15/01/2016		30/12/2015		Sí	0.1
53	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del RSND CAF_Enero 2016	5-Entregables Intermedios	15/02/2016		29/01/2016		Sí	0.1

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
54	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del RSND CAF_Febrero 2016	5-Entregables Intermedios	15/03/2016		29/02/2016		Sí	0.1
55	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del RSND CAF_Marzo 2016	5-Entregables Intermedios	15/04/2016		31/03/2016		Sí	0.1
56	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del RSND CAF_Abril 2016	5-Entregables Intermedios	15/05/2016		29/04/2016		Sí	0.1
57	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del RSND CAF_Mayo 2016	5-Entregables Intermedios	15/06/2016		31/05/2016		Sí	0.1
58	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del RSND CAF_Junio 2016	5-Entregables Intermedios	15/07/2016		01/07/2016		Sí	0.1
59	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 50 %_CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-001	5-Entregables Intermedios	29/07/2016		01/08/2016		Sí	0.2
60	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 50 %_CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-004	5-Entregables Intermedios	29/07/2016		01/08/2016		Sí	0.2
61	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 50 %_CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-006	5-Entregables Intermedios	29/07/2016		01/08/2016		Sí	0.2
62	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 50 %_CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-007	5-Entregables Intermedios	29/07/2016		01/08/2016		Sí	0.2
63	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 50 %_CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-008	5-Entregables Intermedios	29/07/2016		01/08/2016		Sí	0.2
64	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 50 %_CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-009	5-Entregables Intermedios	29/07/2016		01/08/2016		Sí	0.2
65	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 50 %_CAF-RSND-EEQ-DI-BS-001_CORPORATIVO	5-Entregables Intermedios	29/07/2016		01/08/2016		Sí	4.6
66	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 50 %_CAF-RSND-EEQ-LPI-BI-002	5-Entregables Intermedios	29/07/2016		01/08/2016		Sí	0.8
67	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 50 %_CAF-RSND-EEQ-LPI-BI-003	5-Entregables Intermedios	29/07/2016		01/08/2016		Sí	0.5
68	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 50 %_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-001	5-Entregables Intermedios	29/07/2016		01/08/2016		Sí	1.0
69	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 50 %_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-002	5-Entregables Intermedios	29/07/2016		01/08/2016		Sí	1.1
70	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 50 %_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-003	5-Entregables Intermedios	29/07/2016		01/08/2016		Sí	0.8
71	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 50 %_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-004	5-Entregables Intermedios	29/07/2016		01/08/2016		Sí	1.0
72	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 50 %_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-006	5-Entregables Intermedios	29/07/2016		01/08/2016		Sí	1.0
73	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 50 %_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-007	5-Entregables Intermedios	29/07/2016		01/08/2016		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
74	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 50 %_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-008	5-Entregables Intermedios	29/07/2016		01/08/2016		Sí	0.9
75	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 50 %_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-009	5-Entregables Intermedios	29/07/2016		01/08/2016		Sí	0.9
76	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 50 %_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-010	5-Entregables Intermedios	29/07/2016		01/08/2016		Sí	0.5
77	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 50 %_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-011	5-Entregables Intermedios	29/07/2016		01/08/2016		Sí	1.1
78	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 50 %_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-012	5-Entregables Intermedios	29/07/2016		01/08/2016		Sí	0.9
79	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 50 %_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-013	5-Entregables Intermedios	29/07/2016		01/08/2016		Sí	0.7
80	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 50 %_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-014	5-Entregables Intermedios	29/07/2016		01/08/2016		Sí	1.0
81	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 50 %_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-015	5-Entregables Intermedios	29/07/2016		01/08/2016		Sí	0.8
82	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del RSND CAF_Julio 2016	5-Entregables Intermedios	15/08/2016		01/08/2016		Sí	0.1
83	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del RSND CAF_Agosto 2016	5-Entregables Intermedios	15/09/2016		31/08/2016		Sí	0.1
84	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del RSND CAF_Septiembre 2016	5-Entregables Intermedios	15/10/2016		15/10/2016		Sí	0.1
85	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del RSND CAF_Octubre 2016	5-Entregables Intermedios	15/11/2016		15/11/2016		Sí	0.1
86	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del RSND CAF_Noviembre 2016	5-Entregables Intermedios	15/12/2016		15/12/2016		Sí	0.1
87	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 75 %_CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-001	5-Entregables Intermedios	30/12/2016		31/12/2016		Sí	0.2
88	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 75 %_CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-004	5-Entregables Intermedios	30/12/2016		31/12/2016		Sí	0.2
89	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 75 %_CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-006	5-Entregables Intermedios	30/12/2016		31/12/2016		Sí	0.2
90	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 75 %_CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-007	5-Entregables Intermedios	30/12/2016		31/12/2016		Sí	0.2
91	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 75 %_CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-008	5-Entregables Intermedios	30/12/2016		31/12/2016		Sí	0.2
92	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 75 %_CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-009	5-Entregables Intermedios	30/12/2016		31/12/2016		Sí	0.2
93	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 75 %_CAF-RSND-EEQ-DI-BS-001_CORPORATIVO	5-Entregables Intermedios	30/12/2016		01/08/2016		Sí	4.6

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
94	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 75 %_CAF-RSND-EEQ-LPI-BI-002	5-Entregables Intermedios	30/12/2016		31/12/2016		Sí	0.8
95	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 75 %_CAF-RSND-EEQ-LPI-BI-003	5-Entregables Intermedios	30/12/2016		31/12/2016		Sí	0.5
96	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 75 %_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-001	5-Entregables Intermedios	30/12/2016		31/12/2016		Sí	1.0
97	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 75 %_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-002	5-Entregables Intermedios	30/12/2016		31/12/2016		Sí	1.1
98	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 75 %_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-003	5-Entregables Intermedios	30/12/2016		31/12/2016		Sí	0.8
99	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 75 %_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-004	5-Entregables Intermedios	30/12/2016		31/12/2016		Sí	1.0
100	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 75 %_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-006	5-Entregables Intermedios	30/12/2016		31/12/2016		Sí	1.0
101	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 75 %_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-007	5-Entregables Intermedios	30/12/2016		31/12/2016		Sí	1.0
102	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 75 %_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-008	5-Entregables Intermedios	30/12/2016		31/01/2017		Sí	0.9
103	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 75 %_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-009	5-Entregables Intermedios	30/12/2016		31/12/2016		Sí	0.9
104	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 75 %_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-010	5-Entregables Intermedios	30/12/2016		31/12/2016		Sí	0.5
105	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 75 %_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-011	5-Entregables Intermedios	30/12/2016		31/12/2016		Sí	1.1
106	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 75 %_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-012	5-Entregables Intermedios	30/12/2016		31/12/2016		Sí	0.9
107	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 75 %_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-013	5-Entregables Intermedios	30/12/2016		31/12/2016		Sí	0.7
108	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 75 %_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-014	5-Entregables Intermedios	30/12/2016		31/12/2016		Sí	1.0
109	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 75 %_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-015	5-Entregables Intermedios	30/12/2016		31/12/2016		Sí	0.8
110	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del RSND CAF_Diciembre 2016	5-Entregables Intermedios	15/01/2017		30/12/2016		Sí	0.1
111	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del RSND CAF_Enero 2017	5-Entregables Intermedios	15/02/2017		02/02/2017		Sí	0.1
112	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del RSND CAF_Febrero 2017	5-Entregables Intermedios	15/03/2017		03/03/2017		Sí	0.1
113	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-002	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/03/2017		18/05/2017		Sí	0.7

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
114	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-003	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/03/2017		31/03/2017		Sí	0.5
115	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-004	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/03/2017		31/03/2017		Sí	0.6
116	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-001	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/03/2017	31/07/2017			No	0.1
117	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-004	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/03/2017	31/07/2017			No	0.1
118	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-006	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/03/2017	31/07/2017			No	0.1
119	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-007	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/03/2017		05/05/2017		Sí	0.1
120	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-008	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/03/2017	31/07/2017			No	0.1
121	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-009	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/03/2017	31/07/2017			No	0.1
122	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_CAF-RSND-EEQ-DI-BI-001_CORPORATIVO	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/03/2017		01/08/2016		Sí	3.0
123	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_CAF-RSND-EEQ-LPI-BI-002	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/03/2017		16/03/2017		Sí	0.6
124	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_CAF-RSND-EEQ-LPI-BI-003	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/03/2017		16/03/2017		Sí	0.3
125	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-001	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/03/2017		18/05/2017		Sí	0.7
126	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-006	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/03/2017	31/07/2017			No	0.6
127	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-007	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/03/2017		29/05/2017		Sí	0.7
128	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-008	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/03/2017		29/05/2017		Sí	0.6
129	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-009	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/03/2017		27/03/2017		Sí	0.6
130	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-010	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/03/2017	31/07/2017			No	0.3
131	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-011	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/03/2017	31/07/2017			No	0.7
132	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-012	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/03/2017		31/03/2017		Sí	0.6
133	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-013	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/03/2017		27/03/2017		Sí	0.4

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
134	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-014	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/03/2017		31/03/2017		Sí	0.7
135	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-015	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/03/2017		24/05/2017		Sí	0.5
136	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del RSND CAF_Marzo 2017	5-Entregables Intermedios	15/04/2017		31/03/2017		Sí	0.1
137	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del RSND CAF_Abril 2017	5-Entregables Intermedios	15/05/2017		28/04/2017		Sí	0.1
138	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del RSND CAF_Mayo 2017	5-Entregables Intermedios	15/06/2017		01/06/2017		Sí	0.1
139	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del RSND CAF_Junio 2017	5-Entregables Intermedios	15/07/2017		03/07/2017		Sí	0.1
140	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del RSND CAF_Julio 2017	5-Entregables Intermedios	15/08/2017		03/08/2017		Sí	0.1
141	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del RSND CAF_Agosto 2017	5-Entregables Intermedios	15/09/2017	15/09/2017			No	0.1
142	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del RSND CAF_Septiembre 2017	5-Entregables Intermedios	15/10/2017	15/10/2017			No	0.1
143	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del RSND CAF_Octubre 2017	5-Entregables Intermedios	15/11/2017	15/11/2017			No	0.1
144	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del RSND CAF_Noviembre 2017	5-Entregables Intermedios	15/12/2017	15/12/2017			No	0.1
145	CIERRE_Liquidación de Obras_CAF-RSND-EEQ-LPI-BI-003	9-Entregables Formales	31/12/2017		17/03/2017		Sí	0.1
146	CIERRE_Liquidación de Obras_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-002	9-Entregables Formales	31/12/2017		18/05/2017		Sí	0.2
147	CIERRE_Liquidación de Obras_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-004	9-Entregables Formales	31/12/2017		02/05/2017		Sí	0.2
148	CIERRE_Liquidación de Obras_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-006	9-Entregables Formales	31/12/2017	31/12/2017			No	0.2
149	CIERRE_Liquidación de Obras_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-010	9-Entregables Formales	31/12/2017	31/12/2017			No	0.1
150	CIERRE_Liquidación de Obras_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-011	9-Entregables Formales	31/12/2017	31/12/2017			No	0.2
151	CIERRE_Liquidación de Obras_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-012	9-Entregables Formales	31/12/2017	31/12/2017			No	0.2
152	CIERRE_Liquidación de Obras_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-013	9-Entregables Formales	31/12/2017	31/12/2017			No	0.1
153	CIERRE_Liquidación de Obras_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-014	9-Entregables Formales	31/12/2017	31/12/2017			No	0.2

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
154	CIERRE_Liquidación de Obras_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-015	9-Entregables Formales	31/12/2017	31/12/2017			No	0.2
155	CIERRE_Liquidación de Obras_CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-001	9-Entregables Formales	31/12/2017	31/12/2017			No	0.01
156	CIERRE_Liquidación de Obras_CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-004	9-Entregables Formales	31/12/2017	31/12/2017			No	0.01
157	CIERRE_Liquidación de Obras_CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-006	9-Entregables Formales	31/12/2017	31/12/2017			No	0.01
158	CIERRE_Liquidación de Obras_CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-007	9-Entregables Formales	31/12/2017		05/05/2017		Sí	0.01
159	CIERRE_Liquidación de Obras_CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-008	9-Entregables Formales	31/12/2017	31/12/2017			No	0.01
160	CIERRE_Liquidación de Obras_CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-009	9-Entregables Formales	31/12/2017	31/12/2017			No	0.01
161	CIERRE_Liquidación de Obras_CAF-RSND-EEQ-DI-BE-001_CORPORATIVO	9-Entregables Formales	31/12/2017		01/08/2016		Sí	0.9
162	CIERRE_Liquidación de Obras_CAF-RSND-EEQ-LPI-BI-002	9-Entregables Formales	31/12/2017		17/03/2017		Sí	0.4
163	CIERRE_Liquidación de Obras_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-001	9-Entregables Formales	31/12/2017		18/05/2017		Sí	0.4
164	CIERRE_Liquidación de Obras_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-003	9-Entregables Formales	31/12/2017		02/05/2017		Sí	0.4
165	CIERRE_Liquidación de Obras_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-007	9-Entregables Formales	31/12/2017	31/12/2017			No	0.4
166	CIERRE_Liquidación de Obras_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-008	9-Entregables Formales	31/12/2017	31/12/2017			No	0.4
167	CIERRE_Liquidación de Obras_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-009	9-Entregables Formales	31/12/2017	31/12/2017			No	0.38
168	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del RSND CAF_Diciembre 2017	5-Entregables Intermedios	15/01/2018	15/01/2018			No	0.1

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Periodo	Meta	Resultado del Periodo	Fecha de Inicio	Último Periodo Actualizado
1	FMIk - Frecuencia de interrupción a nivel de cabecera de los alimentadores primarios de distribución		83.44 %	3.02	2.52	01/07/2015	Julio
2	TTIk - Tiempo de interrupción a nivel de cabecera de alimentador primario de distribución		73.09 %	2.49	1.82	01/07/2015	Julio
3	PEF - Porcentaje de Errores en la Facturación		60.00 %	0.3	0.18	01/07/2015	Julio


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	20,732,955.10 **
Costo Total:	22,026,704.92
Total Devengado:	19,570,231.72
% Costo Total Devengado:	88.85 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 88.85 %

Perfil Económico 2017

	Años Previos	Año Actual (2017)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	41,870,130.27	2,443,002.00	0.00	44,313,132.27
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	41,870,130.27	2,443,002.00	0.00	44,313,132.27
Ppto. Codificado	41,870,130.27	2,443,002.00	0.00	44,313,132.27
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2017)		0.00		
Programado a Devengar	20,810,470.88	2,443,002.00	0.00	23,253,472.88
Ppto. Devengado	18,289,953.10	1,280,278.62	0.00	19,570,231.72
Estimado a fin de año	* 18,289,953.10	2,443,002.00	0.00	20,732,955.10
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	2,520,517.78	0.00	0.00	2,520,517.78
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 87.89 %	52.41 %	0.00 %	84.16 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2017

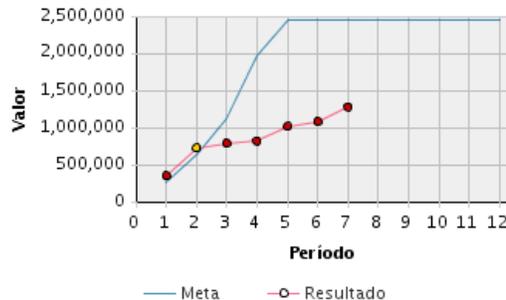

Presupuesto Mensual 2017

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	262,321.21	346,934.97	262,321.21	346,934.97	132.26 %		14.20 %

Presupuesto Mensual 2017							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	374,969.71	374,969.71	637,290.92	721,904.68	113.28 %		29.55 %
Mar	482,596.48	66,770.06	1,119,887.40	788,674.74	70.42 %		32.28 %
Abr	853,524.24	27,135.04	1,973,411.64	815,809.78	41.34 %		33.39 %
May	469,590.36	195,471.10	2,443,002.00	1,011,280.88	41.40 %		41.40 %
Jun	0.00	70,643.32	2,443,002.00	1,081,924.20	44.29 %		44.29 %
Jul	0.00	198,354.42	2,443,002.00	1,280,278.62	52.41 %		52.41 %
Ago	0.00		2,443,002.00				
Sep	0.00		2,443,002.00				
Oct	0.00		2,443,002.00				
Nov	0.00		2,443,002.00				
Dic	0.00		2,443,002.00				
Total	2,443,002.00	1,280,278.62					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

- | | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Incrementar la capacidad instalada en redes de medio, bajo voltaje y alumbrado público MEDIANTE la ejecución de los planes anuales de expansión, la construcción, mejora y remodelación de redes de distribución y alumbrado público. |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Acta Resolución de Adjudicación CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-001	CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-001.pdf	06/11/2015
2	Acta Resolución de Adjudicación CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-004	CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-004.pdf	06/11/2015
3	Acta Resolución de Adjudicación CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-006	CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-006.pdf	06/11/2015
4	Acta Resolución de Adjudicación CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-007	CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-007.pdf	06/11/2015
5	Acta Resolución de Adjudicación CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-008	CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-008.pdf	06/11/2015
6	Acta Resolución de Adjudicación CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-009	CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-009.pdf	06/11/2015
7	Acta Resolución de Adjudicación CAF-RSND-EEQ-DI-BI-001	CAF-RSND-EEQ-DI-BI-001.zip	17/11/2015
8	Acta Resolución de Adjudicación CAF-RSND-EEQ-LPI-BI-002	CAF-RSND-EEQ-LPI-BI-002.pdf	17/11/2015
9	Acta Resolución de Adjudicación CAF-RSND-EEQ-LPI-BI-003	CAF-RSND-EEQ-LPI-BI-003.pdf	17/11/2015
10	Acta Resolución de Adjudicación CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-001	CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-001.pdf	06/11/2015
11	Acta Resolución de Adjudicación CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-002	CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-002.pdf	06/11/2015
12	Acta Resolución de Adjudicación CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-003	CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-003.pdf	06/11/2015
13	Acta Resolución de Adjudicación CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-004	CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-004.pdf	06/11/2015
14	Acta Resolución de Adjudicación CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-006	CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-006.pdf	06/11/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
15	Acta Resolución de Adjudicación CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-007	CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-007.pdf	06/11/2015
16	Acta Resolución de Adjudicación CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-008	CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-007.pdf	06/11/2015
17	Acta Resolución de Adjudicación CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-009	CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-009.pdf	06/11/2015
18	Acta Resolución de Adjudicación CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-010	CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-010.pdf	06/11/2015
19	Acta Resolución de Adjudicación CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-011	CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-011.pdf	06/11/2015
20	Acta Resolución de Adjudicación CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-012	CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-012.pdf	06/11/2015
21	Acta Resolución de Adjudicación CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-013	CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-013.pdf	06/11/2015
22	Acta Resolución de Adjudicación CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-014	CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-014.pdf	06/11/2015
23	Acta Resolución de Adjudicación CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-015	CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-015.pdf	06/11/2015
24	Cumplimiento del Hito Ejecución_Informe Mensual de Avance de CAF_Abril 2016	Informe.pdf	16/09/2016
25	Cumplimiento del Hito Ejecución_Informe Mensual de Avance de CAF_Agosto 2016	Informe.pdf	16/09/2016
26	Cumplimiento del Hito Ejecución_Informe Mensual de Avance de CAF_Diciembre 2016	Informe.pdf	30/12/2016
27	Cumplimiento del Hito Ejecución_Informe Mensual de Avance de CAF_Enero 2016	Informe.pdf	16/09/2016
28	Cumplimiento del Hito Ejecución_Informe Mensual de Avance de CAF_Enero 2017	Informe.pdf	02/02/2017
29	Cumplimiento del Hito Ejecución_Informe Mensual de Avance de CAF_Febrero 2016	Informe.pdf	16/09/2016
30	Cumplimiento del Hito Ejecución_Informe Mensual de Avance de CAF_Julio 2016	Informe.pdf	16/09/2016
31	Cumplimiento del Hito Ejecución_Informe Mensual de Avance de CAF_Junio 2016	Informe.pdf	16/09/2016
32	Cumplimiento del Hito Ejecución_Informe Mensual de Avance de CAF_Marzo 2016	Informe.pdf	16/09/2016
33	Cumplimiento del Hito Ejecución_Informe Mensual de Avance de CAF_Mayo 2016	Informe.pdf	16/09/2016
34	Cumplimiento del Hito Ejecución_Informe Mensual de Avance de CAF_Noviembre 2016	Informe.pdf	01/12/2016
35	Cumplimiento del Hito Ejecución_Informe Mensual de Avance de CAF_Octubre 2016	Informe.pdf	01/11/2016
36	Cumplimiento del Hito Ejecución_Informe Mensual de Avance de CAF_Septiembre 2016	Informe.pdf	08/02/2017
37	Finalización de Obras_CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-007	Acta_de_entrega_recepción_provisional.pdf	05/05/2017
38	Finalización de Obras_CAF-RSND-EEQ-DI-BE-001_CORPORATIVO	Resolución_de_recepción_definitiva.pdf	30/03/2017
39	Finalización de Obras_CAF-RSND-EEQ-LPI-BI-002	Acta_entrega_recepción_provisional.pdf	17/03/2017
40	Finalización de Obras_CAF-RSND-EEQ-LPI-BI-003	Acta_recepción_provisional.pdf	17/03/2017
41	Finalización de Obras_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-001	Acta_de_entrega_recepción_provisional.pdf	18/05/2017
42	Finalización de Obras_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-002	Acta_de_entrega_recepción_provisional.pdf	18/05/2017
43	Finalización de Obras_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-003	Acta_de_entrega_recepción_provisional.pdf	05/05/2017
44	Finalización de Obras_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-004	Acta_de_entrega_recepción_provisional.pdf	05/05/2017
45	Finalización de Obras_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-006	Acta_de_entrega_recepción_provisional.pdf	20/06/2017
46	Finalización de Obras_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-007	Acta_de_entrega_recepción_provisional.pdf	29/05/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
47	Finalización de Obras_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-008	Acta_de_entrega_recepción_provisional.pdf	20/06/2017
48	Finalización de Obras_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-009	Acta_de_entrega_recepción_provisional.pdf	27/03/2017
49	Finalización de Obras_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-012	Acta_de_entrega_recepción_provisional.pdf	28/06/2017
50	Finalización de Obras_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-013	Acta_de_entrega_recepción_provisional.pdf	27/03/2017
51	Finalización de Obras_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-014	Acta_de_entrega_recepción_provisional.pdf	29/06/2017
52	Finalización de Obras_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-015	Acta_de_entrega_recepción_provisional.pdf	20/06/2017
53	Informe Ejecución Obra 50%_CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-001	CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-001.pdf	08/02/2017
54	Informe Ejecución Obra 50%_CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-004	CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-004.pdf	08/02/2017
55	Informe Ejecución Obra 50%_CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-006	CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-006.pdf	08/02/2017
56	Informe Ejecución Obra 50%_CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-008	CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-008.pdf	08/02/2017
57	Informe Ejecución Obra 50%_CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-009	CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-009.pdf	08/02/2017
58	Informe Ejecución Obra 50%_CAF-RSND-EEQ-DI-BS-001	CAF-RSND-EEQ-DI-BS-001.pdf	01/08/2016
59	Informe Ejecución Obra 50%_CAF-RSND-EEQ-LPI-BI-002	CAF-RSND-EEQ-LPI-BI-002.pdf	08/02/2017
60	Informe Ejecución Obra 50%_CAF-RSND-EEQ-LPI-BI-003	CAF-RSND-EEQ-LPI-BI-003.pdf	08/02/2017
61	Informe Ejecución Obra 50%_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-003	CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-003.pdf	20/02/2017
62	Informe Ejecución Obra 50%_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-004	CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-004.pdf	20/02/2017
63	Informe Ejecución Obra 50%_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-006	CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-006.pdf	20/02/2017
64	Informe Ejecución Obra 50%_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-007	CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-007.pdf	20/02/2017
65	Informe Ejecución Obra 50%_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-008	CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-008.pdf	20/02/2017
66	Informe Ejecución Obra 50%_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-009	CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-009.pdf	20/02/2017
67	Informe Ejecución Obra 50%_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-010	CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-010.pdf	20/02/2017
68	Informe Ejecución Obra 50%_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-011	CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-011.pdf	21/02/2017
69	Informe Ejecución Obra 50%_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-012	CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-012.pdf	21/02/2017
70	Informe Ejecución Obra 50%_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-013	CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-013.pdf	21/02/2017
71	Informe Ejecución Obra 50%_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-014	CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-014.pdf	21/02/2017
72	Informe Ejecución Obra 50%_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-015	CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-015.pdf	21/02/2017
73	Informe Ejecución Obra 75%_CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-001	CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-001.pdf	08/02/2017
74	Informe Ejecución Obra 75%_CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-004	CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-004.pdf	08/02/2017
75	Informe Ejecución Obra 75%_CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-006	CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-006.pdf	08/02/2017
76	Informe Ejecución Obra 75%_CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-008	CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-008.pdf	08/02/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
77	Informe Ejecución Obra 75%_CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-009	CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-009.pdf	08/02/2017
78	Informe Ejecución Obra 75%_CAF-RSND-EEQ-DI-BS-001	CAF-RSND-EEQ-DI-BS-001.pdf	01/08/2016
79	Informe Ejecución Obra 75%_CAF-RSND-EEQ-LPI-BI-002	CAF-RSND-EEQ-LPI-BI-002.pdf	08/02/2017
80	Informe Ejecución Obra 75%_CAF-RSND-EEQ-LPI-BI-003	CAF-RSND-EEQ-LPI-BI-003.pdf	08/02/2017
81	Informe Ejecución Obra 75%_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-003	CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-003.pdf	21/02/2017
82	Informe Ejecución Obra 75%_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-004	CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-004.pdf	21/02/2017
83	Informe Ejecución Obra 75%_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-006	CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-006.pdf	21/02/2017
84	Informe Ejecución Obra 75%_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-007	CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-007.pdf	21/02/2017
85	Informe Ejecución Obra 75%_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-008	CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-008.pdf	21/02/2017
86	Informe Ejecución Obra 75%_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-009	CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-009.pdf	21/02/2017
87	Informe Ejecución Obra 75%_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-010	CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-010.pdf	21/02/2017
88	Informe Ejecución Obra 75%_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-011	CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-011.pdf	21/02/2017
89	Informe Ejecución Obra 75%_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-012	CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-012.pdf	21/02/2017
90	Informe Ejecución Obra 75%_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-013	CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-013.pdf	21/02/2017
91	Informe Ejecución Obra 75%_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-014	CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-014.pdf	21/02/2017
92	Informe Ejecución Obra 75%_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-015	CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-015.pdf	21/02/2017
93	Informe Finalización Obra_CAF-RSND-EEQ-DI-BS-001	CAF-RSND-EEQ-DI-BS-001.pdf	01/08/2016
94	Informe Finalización Obra_CAF-RSND-EEQ-LPI-BI-002	CAF-RSND-EEQ-LPI-BI-002.pdf	08/02/2017
95	Informe Finalización Obra_CAF-RSND-EEQ-LPI-BI-003	CAF-RSND-EEQ-LPI-BI-003.pdf	08/02/2017
96	Informe Liquidación Obra_CAF-RSND-EEQ-DI-BS-001	CAF-RSND-EEQ-DI-BS-001.pdf	01/08/2016
97	Informe Liquidación Obra_CAF-RSND-EEQ-LPI-BI-002	CAF-RSND-EEQ-LPI-BI-002.pdf	08/02/2017
98	Informe Liquidación Obra_CAF-RSND-EEQ-LPI-BI-003	CAF-RSND-EEQ-LPI-BI-003.pdf	08/02/2017
99	Informe Mensual de Avance del RSND CAF_Abril 2017	Informe.pdf	28/04/2017
100	Informe Mensual de Avance del RSND CAF_Agosto 2015	Informe.pdf	21/02/2017
101	Informe Mensual de Avance del RSND CAF_Diciembre 2015	Informe.pdf	08/01/2016
102	Informe Mensual de Avance del RSND CAF_Febrero 2017	Informe.pdf	06/03/2017
103	Informe Mensual de Avance del RSND CAF_Julio 2015	Informe.pdf	23/02/2017
104	Informe Mensual de Avance del RSND CAF_Julio 2017	Informe.pdf	03/08/2017
105	Informe Mensual de Avance del RSND CAF_Junio 2017	Informe.pdf	30/06/2017
106	Informe Mensual de Avance del RSND CAF_Marzo 2017	Informe.pdf	31/03/2017
107	Informe Mensual de Avance del RSND CAF_Mayo 2017	Informe.pdf	02/06/2017
108	Informe Mensual de Avance del RSND CAF_Noviembre 2015	Informe.pdf	23/02/2017
109	Informe Mensual de Avance del RSND CAF_Octubre 2015	Informe.pdf	21/02/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
110	Informe Mensual de Avance del RSND CAF_Septiembre 2015	Informe.pdf	23/02/2017
111	Liquidación de Obras_CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-007	Acta_de_entrega_recepción_definitiva.pdf	05/05/2017
112	Liquidación de Obras_CAF-RSND-EEQ-LPI-BI-002	Acta_de_recepción_definitiva.pdf	17/03/2017
113	Liquidación de Obras_CAF-RSND-EEQ-LPI-BI-003	Acta_recepción_definitiva.pdf	17/03/2017
114	Liquidación de Obras_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-001	Acta_de_entrega_recepción_definitiva.pdf	18/05/2017
115	Liquidación de Obras_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-002	Acta_de_entrega_recepción_definitiva.pdf	18/05/2017
116	Liquidación de Obras_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-003	Acta_de_entrega_recepción_definitiva.pdf	02/05/2017
117	Liquidación de Obras_CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-004	Acta_de_entrega_recepción_definitiva.pdf	02/05/2017
118	Resolución Gerencia General Inicio de Proceso CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-001	CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-001.pdf	08/02/2017
119	Resolución Gerencia General inicio de Proceso CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-004	CAF-RNSD-EEQ-CPN-FC-004.pdf	29/10/2015
120	Resolución Gerencia General inicio de Proceso CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-006	CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-006.pdf	29/10/2015
121	Resolución Gerencia General Inicio de Proceso CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-007	CAF-RNSD-EEQ-CPN-FC-007.pdf	29/10/2015
122	Resolución Gerencia General inicio de Proceso CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-008	CAF-RNSD-EEQ-CPN-FC-008.pdf	29/10/2015
123	Resolución Gerencia General inicio de Proceso CAF-RSND-EEQ-CPN-FC-009	CAF-RNSD-EEQ-CPN-FC-009.pdf	29/10/2015
124	Resolución Gerencia General inicio de Proceso CAF-RSND-EEQ-DI-BS-001-CORPORATIVO.	CAF-RSND-EEQ-DI-BS-001.pdf	29/10/2015
125	Resolución Gerencia General inicio de Proceso CAF-RSND-EEQ-LPI-BI-002	CAF-RSND-EEQ-LPI-BI-002.pdf	29/10/2015
126	Resolución Gerencia General inicio de Proceso CAF-RSND-EEQ-LPI-BI-003	CAF-RSND-EEQ-LPI-BI-003.pdf	29/10/2015
127	Resolución Gerencia General inicio de Proceso CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-001	CAF-RNSD-EEQ-LPN-OB-001.pdf	29/10/2015
128	Resolución Gerencia General inicio de Proceso CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-002	CAF-RNSD-EEQ-LPN-OB-002.pdf	29/10/2015
129	Resolución Gerencia General inicio de Proceso CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-003	CAF-RNSD-EEQ-LPN-OB-003.pdf	29/10/2015
130	Resolución Gerencia General inicio de Proceso CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-004	CAF-RNSD-EEQ-LPN-OB-004.pdf	29/10/2015
131	Resolución Gerencia General inicio de Proceso CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-006	CAF-RNSD-EEQ-LPN-OB-006.pdf	29/10/2015
132	Resolución Gerencia General inicio de Proceso CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-007	CAF-RNSD-EEQ-LPN-OB-007.pdf	29/10/2015
133	Resolución Gerencia General inicio de Proceso CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-008	CAF-RNSD-EEQ-LPN-OB-008.pdf	29/10/2015
134	Resolución Gerencia General inicio de Proceso CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-009	CAF-RNSD-EEQ-LPN-OB-009.pdf	29/10/2015
135	Resolución Gerencia General inicio de Proceso CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-010	CAF-RNSD-EEQ-LPN-OB-010.pdf	29/10/2015
136	Resolución Gerencia General inicio de Proceso CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-011	CAF-RNSD-EEQ-LPN-OB-011.pdf	29/10/2015
137	Resolución Gerencia General inicio de Proceso CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-012	CAF-RNSD-EEQ-LPN-OB-012.pdf	29/10/2015
138	Resolución Gerencia General inicio de Proceso CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-013	CAF-RNSD-EEQ-LPN-OB-013.pdf	29/10/2015
139	Resolución Gerencia General inicio de Proceso CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-014	CAF-RNSD-EEQ-LPN-OB-014.pdf	29/10/2015
140	Resolución Gerencia General inicio de Proceso CAF-RSND-EEQ-LPN-OB-015	CAF-RNSD-EEQ-LPN-OB-015.pdf	29/10/2015

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Guerrero Melo, Mónica Patricia	Ejecutor del proyecto	Directora de Comercialización Clientes Especiales y Telemedición - EEQ	moguerrero@eeq.com.ec	
Maldonado Palacios, Edgar Remigio	Analista	Director Pérdidas Comerciales - EEQ	rmaldonado@eeq.com.ec	
