

EEQ - Empresa Eléctrica Quito
Gerencia de Planificación
Dirección de TICS

PROYECTO: I022 EEQ - INV - Proyecto SIGDE

Líder del Proyecto:	Morales Cardoso, Jorge Arturo (jmorales@eeq.com.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Páez Chacón, Gonzalo Ulpiano Enrique	Programas Relacionados:	
Titular:	Morales Cardoso, Jorge Arturo	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Tecnología	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	4,090,046.87
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2016 - 04/01/2017
Fecha de última actualización:	05/04/2017	Fecha de Fin Base:	30/12/2016
Modificado por:	Morales Cardoso, Jorge Arturo	Fecha del siguiente Hito:	


DATOS GENERALES

Descripción
PROPÓSITO: Proyecto gestiona la participación de la EEQ como parte del proyecto SIGDE impulsado desde el MEER PRODUCTO: implantación de sistemas de misión crítica, estandarización de la tecnología de información y de comunicaciones, establecimiento de centros de datos únicos para las Empresas de Distribución Eléctrica
Beneficios Cualitativos
Gestión y control de la participación económica de EEQ como parte del proyecto SIGDE.
Tipo de Beneficiario
Usuarios internos y externos
Restricciones
TIEMPO: 24 meses COSTO: \$ 3.118.868 CALIDAD: Mejorar la tecnología de servidores, alta disponibilidad, flexibilidad de crecimiento

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	-----------	--------	-------------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 100.00 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2016 Fecha de Fin: 04/01/2017

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

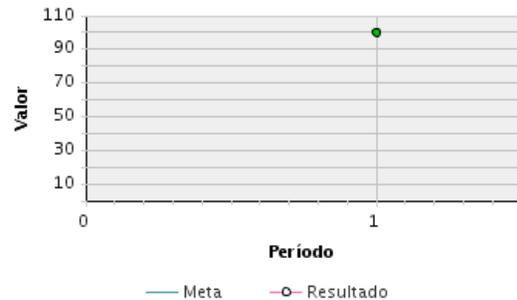

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2017	Avance programado acumulado											

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	100 %											
	Avance real acumulado											
	100 %											
	Estado											
												

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Enero 2017: Proyecto completado con la ejecución presupuestaria hasta Diciembre 2016.	Morales Cardoso, Jorge Arturo	05/04/2017 - 08:50 AM
DICIEMBRE 2016: No se registra valores ejecutados en este mes	Morales Cardoso, Jorge Arturo	04/01/2017 - 12:34 PM
NOVIEMBRE 2016: No se registra valores ejecutados en este mes	Morales Cardoso, Jorge Arturo	07/12/2016 - 12:48 PM
OCTUBRE 2016: Se ejecuta el valor de \$ 160 860 relacionado a varios procesos.	Morales Cardoso, Jorge Arturo	09/11/2016 - 08:49 AM
SEPTIEMBRE 2016: Se ejecuta el valor de \$ 786.911,87 asociados a: Pago TELVENT proyecto SCADA OMS contrato SG2692012 y Diseño de Redes DISREQ contrato SG1912016	Morales Cardoso, Jorge Arturo	09/11/2016 - 07:56 AM
AGOSTO 2016: Se ejecuta el valor de \$ 585.693 asociado a Infraestructura Nacional contrato SG042016, Telvent contrato SG3732014	Morales Cardoso, Jorge Arturo	06/10/2016 - 02:21 PM
JULIO 2016: No se registra ejecución de valores en este mes, se mantiene el valor acumulado de ejecución en \$ 2.556.582,00	Morales Cardoso, Jorge Arturo	06/10/2016 - 11:18 AM
JUNIO 2016: No se registra ejecución de valores en este mes, se mantiene el valor acumulado de ejecución en \$ 2.556.582,00	Morales Cardoso, Jorge Arturo	06/10/2016 - 11:16 AM
MAYO 2016 : No se registra ejecución de valores en este mes, se mantiene el valor acumulado de ejecución en \$ 2.556.582,00	Morales Cardoso, Jorge Arturo	06/10/2016 - 11:14 AM
ABRIL 2016 : Se ejecuta valor de \$ 34.228,00 asociado a Pago Consultoria Kruger ARRASTRE DESARROLLO DE LA PLATAFORMA IBM , se tiene una ejecución acumulada de \$2.556.582	Morales Cardoso, Jorge Arturo	06/10/2016 - 11:11 AM
MARZO 2016 : Se ejecuta el valor de \$2.497.105,00 asociado al proyecto Infraestructura Data Cneter Nacional contrato SG0412016	Morales Cardoso, Jorge Arturo	06/10/2016 - 11:09 AM
FEBRERO 2016: Se ejecuta el valor de \$ 25.249,00 asociado a ARRASTRE SCADA DMS OMS contrato SG2552013	Morales Cardoso, Jorge Arturo	06/10/2016 - 11:07 AM
ENERO 2016 : Se incluye dentro del presupuesto el arrastre de partida SIGDE	Morales Cardoso, Jorge Arturo	06/10/2016 - 09:45 AM

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Estudio de situación actual y proyecto realizado	1-Solicitud de Información	01/01/2016		01/01/2016		Sí	10.0
2	PLANIFICACIÓN: Recursos y Presupuesto asignado.	V - Verificación ejecutiva	02/02/2016		02/02/2016		Sí	7.5
3	EJECUCIÓN: Informe mensual de Presupuesto SIGDE ejecutado	V - Verificación ejecutiva	10/03/2016		10/03/2016		Sí	7.5
4	EJECUCIÓN: Informe mensual de Presupuesto SIGDE ejecutado	V - Verificación ejecutiva	11/04/2016		11/04/2016		Sí	7.5
5	EJECUCIÓN: Informe mensual de Presupuesto SIGDE ejecutado	V - Verificación ejecutiva	10/05/2016		10/05/2016		Sí	7.5
6	EJECUCIÓN: Informe mensual de Presupuesto SIGDE ejecutado	V - Verificación ejecutiva	10/06/2016		10/06/2016		Sí	7.5
7	EJECUCIÓN: Informe mensual de Presupuesto SIGDE ejecutado	V - Verificación ejecutiva	11/07/2016		11/07/2016		Sí	7.5
8	EJECUCIÓN: Informe mensual de Presupuesto SIGDE ejecutado	V - Verificación ejecutiva	10/08/2016		10/08/2016		Sí	7.5
9	EJECUCIÓN: Informe mensual de Presupuesto SIGDE ejecutado	V - Verificación ejecutiva	12/09/2016		12/09/2016		Sí	7.5
10	EJECUCIÓN: Informe mensual de Presupuesto SIGDE ejecutado	V - Verificación ejecutiva	10/10/2016		10/10/2016		Sí	7.5
11	EJECUCIÓN: Informe mensual de Presupuesto SIGDE ejecutado	V - Verificación ejecutiva	10/11/2016		09/11/2016		Sí	7.5
12	EJECUCIÓN: Informe mensual de Presupuesto SIGDE ejecutado	V - Verificación ejecutiva	07/12/2016		07/12/2016		Sí	7.5
13	EJECUCIÓN: Informe mensual de Presupuesto SIGDE ejecutado	V - Verificación ejecutiva	04/01/2017		04/01/2017		Sí	7.5

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	4,090,046.87 **
Costo Total:	4,806,507.00
Total Devengado:	4,090,046.87
% Costo Total Devengado:	85.09 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 85.09 %

Perfil Económico 2017

	Años Previos	Año Actual (2017)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	3,118,868.00	0.00	0.00	3,118,868.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	3,118,868.00	0.00	0.00	3,118,868.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2017)		0.00		
Programado a Devengar	4,806,507.00	0.00	0.00	4,806,507.00
Ppto. Devengado	4,090,046.87	0.00	0.00	4,090,046.87
Estimado a fin de año	* 4,090,046.87	0.00	0.00	4,090,046.87
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	716,460.13	0.00	0.00	716,460.13
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 85.09 %	0.00 %	0.00 %	85.09 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2017



Presupuesto Mensual 2017

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				
Feb							

Presupuesto Mensual 2017							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Mar							
Abr							
May							
Jun							
Jul							
Ago							
Sep							
Oct							
Nov							
Dic							
Total	0.00						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
5	Incrementar la innovación tecnológica del Sistema Integrado de Gestión de la Distribución Eléctrica MEDIANTE el control y seguimiento de las nuevas soluciones tecnológicas implementadas en el sector eléctrico nacional

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ASOCIACION HITO 1 DEFINICIÓN: Estudio de situación actual y proyecto realizado	A.1_Informe_Presupuesto_Enero_2016.pdf	06/10/2016
2	ASOCIACION HITO 10 EJECUCIÓN: Informe mensual de Presupuesto SIGDE ejecutado	B.1._Ejecucion__Inversiones_Septiembre_2016.pdf	28/10/2016
3	ASOCIACION HITO 11 EJECUCIÓN: Informe mensual de Presupuesto SIGDE ejecutado	B.2._Ejecucion_Inversiones_Informe_Octubre_2016.pdf	09/11/2016
4	ASOCIACION HITO 12 EJECUCIÓN: Informe mensual de Presupuesto SIGDE ejecutado	B.3._Ejecucion_Inversiones_Informe_Noviembre_2016.pdf	07/12/2016
5	ASOCIACION HITO 13 EJECUCIÓN: Informe mensual de Presupuesto SIGDE ejecutado	B.4._Ejecucion_Inversiones_Informe_Diciembre_2016.pdf	04/01/2017
6	ASOCIACION HITO 2 PLANIFICACIÓN: Recursos y Presupuesto asignado.	A.2_Ejecución_Inversiones_Enero_2016.pdf	06/10/2016
7	ASOCIACION HITO 3 EJECUCIÓN: Informe mensual de Presupuesto SIGDE ejecutado	A.3_Ejecución_Inversiones_Febrero_2016.pdf	06/10/2016
8	ASOCIACION HITO 4 EJECUCIÓN: Informe mensual de Presupuesto SIGDE ejecutado	A.4._Ejecución_Inversiones_Marzo_2016.pdf	06/10/2016
9	ASOCIACION HITO 5 EJECUCIÓN: Informe mensual de Presupuesto SIGDE ejecutado	A.5._Ejecución__Inversiones_Abril_2016.pdf	06/10/2016
10	ASOCIACION HITO 6 EJECUCIÓN: Informe mensual de Presupuesto SIGDE ejecutado	A.6._Ejecucion_Inversiones_Mayo_2016.pdf	06/10/2016
11	ASOCIACION HITO 7 EJECUCIÓN: Informe mensual de Presupuesto SIGDE ejecutado.	A.7._Ejecucion_Inversiones_Junio_2016.pdf	06/10/2016
12	ASOCIACION HITO 8 EJECUCIÓN: Informe mensual de Presupuesto SIGDE ejecutado	A.8._Ejecucion_Inversiones_Julio_2016.pdf	06/10/2016
13	ASOCIACION HITO 9 EJECUCIÓN: Informe mensual de Presupuesto SIGDE ejecutado	A.9._Ejecucion__Inversiones_Agosto_2016.pdf	06/10/2016

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Morales Cardoso, Jorge Arturo	Lider del Proyecto	Director de Tecnología de la Información y Comunicaciones - EEQ	jmorales@eeq.com.ec	
